



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE ABRIL DE 2017

| PERIODO: | ENTIDAD: | MUNICIPIO: | No. De Obra | Descripción | Contratista | Localidad | FÍSICO | | | FINANCIERO | | | INVERSIÓN | | METAS | |
|--------------------------------|-----------|-----------------------|-------------|---|-------------|-----------|--------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|-----------|-------|------------------|-----------|
| | | | | | | | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas |
| ABRIL | QUERÉTARO | CORREGIDORA QUERÉTARO | 601188 | (PRODERMAGICO) MUSEO ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO | | | | | | | | | \$ | \$ | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | | \$ | \$ | | |
| PRODER MAGICO (FEDERAL) | | | | | | | | | | | | | \$ | \$ | | |

LIC. MA. E. YETSI BELTRÁN ILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

PRO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".




ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE ABRIL DE 2017

| PERIODO: ENTIDAD: | ABRIL QUERÉTARO | | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | | | | | | INVERSIÓN | | METAS | | |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|--------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--|---------------------|-----------|
| | MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO | No. De Obra 601168 | Descripción (PRODERMAGICO) MUSEO ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO | FÍSICO | | | FINANCIERO | | | INVERSIÓN APROBADA Total | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA Total | Unidad de Medida | Aprobadas |
| | | | | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | | | | |
| | | | | | | | | | | \$ 5,668,133.40 | \$ - | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | \$ 5,668,133.40 | \$ - | | |

PRODER MAGICO (ESTATAL)


 LIC. MA. E. YETSI BELTRÁN VILDAARREAL
 DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
 SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS



 ARQ. JUAN ANTONIO SOFÓ ORTEGA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA DE LA
 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".




| PERIODO: | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | | | | | | | | | | INVERSIÓN | | METAS | | |
|-----------------|--------------------------|--------|--------------|---------------|-----|--------------|---------------|-------------|---|---|------------------------------|------------------------|---|------------------------------|--|
| | ENTIDAD: | FÍSICO | | | | FINANCIERO | | | | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | Unidad de Medida | Aprobadas | | |
| MUNICIPIO: | QUERÉTARO | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Localidad | Contratista | Description | Total | Total | M2 CUBIERTA | 509.47 | |
| No. De Obra | 61305 | 90% | 10/01/2017 | 06/03/2017 | 63% | 10/01/2017 | | LA CUEVA | EL PUENTE CONSTRUCTORAY EQUIPO SA DE CV | CONSTRUCCION ARCO TECHO PLAZA PUBLICA LA CUEVA | \$ 1,256,262.50 | \$ 792,049.65 | M2 CUBIERTA | 509.47 | |
| | 61304 | 100% | 10/01/2017 | 20/02/2017 | 97% | 10/01/2017 | 31/03/2017 | EL PUEBLITO | JUAN JESUS PATIÑO RODRIGUEZ | REHABILITACION ESPACIO DEPORTIVO UNID DEPORTIVA UAQ | \$ 1,743,737.49 | \$ 1,684,932.85 | M2 PASTO M PINTURA PZA POSTE PZA BANCA | 8354.00 2072.64 2 4 | |
| GEQ 2016 | | | | | | | | | | | TOTALES | \$ 2,999,999.99 | \$ 2,476,982.50 | | |

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE REGISTRO DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS



DR. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

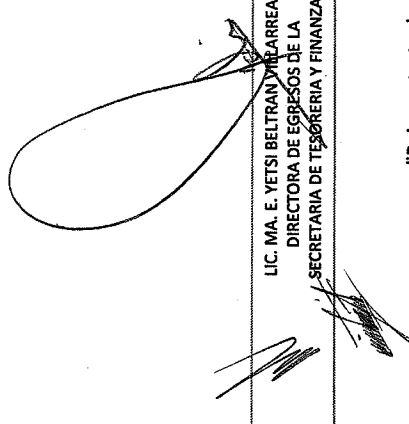





ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE ABRIL DE 2017

| PERIODO: ENTIDAD: | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | | | | | | | | | | INVERSIÓN | | | METAS | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-----------|-------|-------|
| | MUNICIPIO: | No. De Obra | Descripción | Contratista | Localidad | FÍSICO | | | FINANCIERO | | | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | Unidad de Medida | Aprobadas | | |
| | | | | | | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | | | | | Total | Total |
| ABRIL QUERÉTARO | CORREGIDORA QUERÉTARO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 636002 | EMPEDRADO EN VARIAS CALLES EN SAN RAFAEL | OLGA MARIA MARQUEZ DIAZ | LA CUEVA | 83% | 09/01/2017 | 08/08/2017 | 53% | 09/01/2017 | | | \$ 2,999,999.95 | \$ 1,588,999.90 | | | | | |
| 636001 | EMPEDRADO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA CUEVA | KARMINA ROBLES ARELLANO | CORREGIDORA | 90% | 09/01/2017 | 08/08/2017 | 65% | 09/01/2017 | | | \$ 1,999,999.47 | \$ 1,300,446.81 | | | | | |
| FORTALECIMIENTO FINANCIERO | | | | | | | | | | | TOTALES \$ | \$ 4,999,999.42 | \$ 2,889,446.71 | | | | |


 LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILARREAL
 DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
 SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS


 ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA DE LA
 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE ABRIL DE 2017

| PERIODO: | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--|--------|--------------|---------------|------|--------------|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|--|
| | ENTIDAD: | MUNICIPIO: | No. De Obra | FÍSICO | | FINANCIERO | | | INVERSIÓN APROBADA | | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | | METAS | | |
| | QUERÉTARO | CORREGIDORA QUERÉTARO | Description | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas | |
| 621001 | | | PAVIMENTACION DE CALLE CAMINO REAL | 100% | 09/12/2016 | 17/02/2017 | 100% | 09/12/2016 | 30/09/2017 | \$ 3,929,773.24 | \$ 3,923,386.52 | M2 PAVIMENTO | 12449.88 | | |
| 621002 | | | PAVIMENTO ASPALTICO EN CALLES 5 DE MAYO, FCO I MAD | 100% | 09/12/2016 | 17/02/2017 | 100% | 09/12/2016 | 30/09/2017 | \$ 5,631,909.07 | \$ 5,631,816.40 | M2 PAVIMENTO | 14982.32 | | |
| PROGRAMAS REGIONALES 2016 | | | | | | | | | | | TOTALES | \$ 9,561,682.31 | \$ 9,555,202.92 | | |

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQUJUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".




ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE ABRIL DE 2017

| PERIODO: ENTIDAD: | MUNICIPIO: | No. De Obra | Descripción | Contratista | Localidad | FÍSICO | | | FINANCIERO | | | INVERSIÓN | | METAS | | |
|----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|---|--------------|--------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|--------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| | | | | | | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | Unidad de Medida | Aprobadas | |
| ABRIL QUERÉTARO | CORREGIDORA QUERÉTARO | 60228 | URBANIZACION EN VILLA DORADA | COFRU CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE INGENIERÍA SA DE CV | VILLA DORADA | 100% | 25/11/2016 | 02/02/2017 | 0% | 25/11/2016 | 23/03/2017 | \$ 440,235.75 | | M DE GUARNICION M2 DE BANQUETA M2 DE EMPEDRADO M DE TOPE | 155.24 219.85 1132.31 56.59 | |
| FISM 2014 | | | | | | | | | | | | TOTALES | \$ 440,235.75 | \$ | | |



 LIC. MA. E. YETSI BELTRÁN VILLARREAL
 DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
 SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS



 ARQ. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA DE LA
 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



| PERIODO: | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|---|--|-------------------------|--------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| | ENTIDAD: | MUNICIPIO: | No. De Obra | Descripción | Contratista | Localidad | FÍSICO | | | FINANCIERO | | | INVERSIÓN | | METAS | | |
| | | | | | | | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | | | |
| ABRIL | QUERÉTARO | CORREGIDORA QUERÉTARO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6102 | VIVIENDA GASTO DIRECTO | DESARROLLO Y SUMINISTROS SA DE CV | SAN JOSE DE LOS OLIVERA | 100% | 30/05/2016 | 27/09/2016 | 100% | 30/05/2016 | 100% | \$ 977,218.41 | \$ 977,218.41 | \$ 977,218.41 | M CONTRATRABE M2 LOSA | 229.67 312.40 |
| | | | 6113 | EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA | SIGA SOLUCIONES SA DE CV | EL PUEBLITO | 100% | 03/07/2014 | 30/07/2015 | 100% | 03/07/2014 | 100% | \$ 9,422,524.05 | \$ 9,422,524.05 | \$ 9,422,524.05 | EDIFICIO | 1 |
| | | | 6113 | EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA | SEGMENTO QUERÉTANO DE SERVICIOS SA DE CV | EL PUEBLITO | 100% | 03/07/2014 | 30/07/2015 | 60% | 03/07/2014 | 60% | \$ 41,190,000.00 | \$ 24,690,118.36 | \$ 24,690,118.36 | EDIFICIO | 1 |
| | | | 601137 | DUCTERIA INSTALACIONES FIBRA OPTICA C PEDRO URTIAGA DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A GALLEGOS | ARTURO FRANCO | CORREGIDORA | 100% | 16/02/2017 | 17/03/2017 | 100% | 16/02/2017 | 100% | \$ 102,149.11 | \$ 102,149.11 | \$ 102,149.11 | M TUBO | 1860 |
| GASTO DIRECTO 2014 | | | | | | | | | | | | | TOTALES | \$ 51,691,891.58 | \$ 35,192,009.94 | | |


 DR. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA DE LA
 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.


 LIC. MA. E. YETSI BELTRÁN VILLARREAL
 DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
 SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE ABRIL DE 2017

| PERIODO: ENTIDAD: | ABRIL QUERÉTARO | | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | | | | | | | | | | INVERSIÓN | | | |
|----------------------|--|--|--------------------------|-----------|--------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|--------------------|------------------------------|---------------|------------------|-----------|--|
| | MUNICIPIO: | DESCRIPCION | CONTRATISTA | LOCALIDAD | FÍSICO | | | FINANCIERO | | | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS | | | |
| | | | | | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | | | Total | Unidad de Medida | Aprobadas | |
| 638001 | FAFEF URBANIZACION DE VIALIDADES EN 20 DE ENERO | VARGAS JIMENEZ CUAUHTEMOC | | | | | | | | | | \$ | 4,815,160.00 | | | |
| 638002 | FAFEF MEJORAMIENTO VIA PUBLICA ALUMBRADO EM ZAPATA | ARRIAGA TORRIJOS ESTEPHANI | | | | | | | | | | \$ | 2,506,427.08 | | | |
| 638003 | FAFEF URB INTEGRAL VIA PUBL COL LOMAS DE LA CRUZ | GARCIA RIOS JOSE ALONSO | | | | | | | | | | \$ | 2,921,672.28 | | | |
| 638004 | FAFEF INTRO INFRAESTRUCTURA BASC COL AMPL ANGELES | ELECTRICA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CRAVEL, S.A. DE C.V. | | | | | | | | | | \$ | 1,450,035.58 | | | |
| 638005 | FAFEF REHAB BANQUETAS Y VIALIDAD CALLE HIDALGO | CRIBADOS Y TRITURADOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | | | | | | | | | | \$ | 12,887,271.98 | | | |
| 638006 | FAFEF SUST SUPERFICIE PAVIMENTO BANQ COL CANDILES | | | | | | | | | | | \$ | 10,064,030.08 | | | |
| 638007 | FAFEF MEJORAMIENTO SUPERFIC RODAMIENTO COL TEJEDA | GONZALEZ MARTELL ABRAHAM | | | | | | | | | | \$ | 12,255,400.00 | | | |
| 638008 | FAFEF URBANIZACION CALLE PRIVADA FRAY EULALIO | | | | | | | | | | | \$ | 600,000.00 | | | |
| 638009 | FAFEF ALUMBRADO DE UNIDAD DEPORTIVA CANDILES | CIMA ELECTRICO, S.A. DE C.V. | | | | | | | | | | \$ | 2,500,003.00 | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | | \$ | 59,000,000.00 | \$ | | | |

LIC. MA. E. YETSI BELTRÁN VILLARREAL
 DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
 SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARACELI SOTO ORTEGA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE OBRA DE LA
 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE ABRIL DE 2017

| PERIODO: | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|--|-----------------------|-------------|-----------|--------------|---------------|---|--------------|---------------|-------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------|------------|
| | QUERÉTARO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MUNICIPIO: | No. De Obra | Descripción | Contratista | Localidad | FÍSICO | | | FINANCIERO | | | INVERSIÓN APROBADA | | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | | METAS | |
| % | | | | | | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas | | | |
| | 601153 | TORRENTERA PLUVIAL EN AV CAMINO REAL | | | | | | | | | | | \$ | 348,950.00 | | | |
| | 601154 | COLOCACION MALLA CICLONICA PARQUE LINEAL RIB D RIO | | | | | | | | | | | \$ | 701,250.00 | | | |
| | 601155 | LIMPIEZA Y CONFORMACION ESTACIONAMIENTO ALT CAM | | | | | | | | | | | \$ | 910,350.00 | | | |
| | 601156 | PORTERIAS PISO DE CONCRETO Y PINTURA CANCHA USOS M | | | | | | | | | | | \$ | 249,987.00 | | | |
| | 601157 | MANTENIMIENTO VIAL PASEO CONSTITUYENTES | | | | | | | | | | | \$ | 349,530.00 | | | |
| | 601158 | LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA SANTUARIOS | | | | | | | | | | | \$ | 735,000.00 | | | |
| | 601159 | TRABAOS COMPLEMENTARIOS CDC CENTENARIO D LA CONST | | | | | | | | | | | \$ | 1,200,000.00 | | | |
| | 601160 | FORIADO VASO REGULADOR PARA INFRAESTRUCTURA PLUVIA | | | | | | | | | | | \$ | 2,700,000.00 | | | |
| | 601161 | MODULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA MUJN CORREGIDORA | | | | | | | | | | | \$ | 1,600,000.00 | | | |
| | 601162 | REPARACION CONFORMACION ACCESO CENTRAL DE EMERGENC | | | | | | | | | | | \$ | 520,000.00 | | | |
| | 601163 | TRABAOS MENORES MUNICIPIO DE CORREGIDORA | | | | | | | | | | | \$ | 642,608.03 | | | |
| | 601164 | ESTUDIOS D IMPACTO AMBIENTAL DISEÑO DE PAV Y PROYE | CENTENO SILVA ANTONIO | | | | | | | | | | \$ | 3,046,450.00 | 231,162.39 | | |
| | 601165 | TRABAOS COMP SISTEMA CONTRA INCENDIOS ED SEG PUBL | | | | | | | | | | | \$ | 450,000.00 | | | |
| | 601166 | ADECUACION ESPACIO PARA OFICINAS DIR ASUNT CABILDO | | | | | | | | | | | \$ | 1,200,000.00 | | | |
| | 601167 | REGEN VIAL INCORPORACION Y AMPL PITE VEHICULAR RIO | | | | | | | | | | | \$ | 16,007,342.68 | | | |
| | 601169 | TRABAOS COMPL CDH LOS OLVERA SEGUNDA ETAPA | | | | | | | | | | | \$ | 309,691.97 | | | |
| | DIRECTO 2017 | | | | | | | | | | | | TOTALES | \$ | 30,971,155.68 | \$ | 231,162.39 |

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

ARO. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



| PERIODO: ENTIDAD: | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | | | | | | | | | | INVERSIÓN | | METAS | | | | |
|------------------------|--|---|---------------|-------------|------------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|-----------|--|--|
| | MUNICIPIO: | No. De Obra | Descripción | Contratista | Localidad | FÍSICO | | | FINANCIERO | | | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | Total | MIETAS | | | |
| | | | | | | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | | | Unidad de Medida | Aprobadas | | |
| ABRIL QUERÉTARO | CORREGIDORA QUERÉTARO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62301 | ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES | SEGMENTO QUERÉTANO DE SERVICIOS SA DE CV | CANDILES | 22% | 22/06/2015 | 15/08/2015 | 21% | 22/06/2015 | | | \$ 25,000,000.00 | \$ 5,170,878.40 | PZA ALBERCA | 1 | | | |
| 62302 | PUENTE EN RIBERA DEL RIO | HORUS GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV | EL PUEBLITO | 40% | 22/06/2015 | 15/08/2015 | 22% | 22/06/2015 | | | \$ 10,000,000.00 | \$ 2,190,380.22 | PZA PUENTE | 1 | | | |
| 62304 | AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES ENTRONQUE A HUMILPAN | CYME ASFALTOS SA DE CV | SANTA BARBARA | 100% | 06/07/2015 | 15/08/2015 | 100% | 06/07/2015 | | | \$ 9,548,989.37 | \$ 9,548,989.37 | AMPLIACION | 1 | | | |
| 6113 | EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA | SIGA SOLUCIONES SA DE CV | EL PUEBLITO | 100% | 03/07/2014 | 30/07/2015 | 100% | 03/07/2014 | | | \$ 4,575,151.22 | \$ 4,575,151.22 | PZA EDIFICIO | 1 | | | |
| 6113 | EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA | SEGMENTO QUERÉTANO DE SERVICIOS SA DE CV | EL PUEBLITO | 100% | 03/07/2014 | 30/07/2015 | 60% | 03/07/2014 | | | \$ 20,000,000.00 | \$ 11,988,404.15 | PZA EDIFICIO | 1 | | | |
| 62307 | EMPRESTITO REPAVIMENT AV. CANDILES PROLZARAG | ESTATICA SA DE VA | CANDILES | 100% | 22/08/2016 | 16/10/2016 | 100% | 22/08/2016 | 31/12/2016 | | \$ 7,500,000.00 | \$ 7,485,797.50 | M2 RIEGO M2 MORTERO M2 PAVIMENTO M2 PINTURA | 28320 2832 28320 2124 | | | |
| 62308 | 2DA ETAPA REPAVIMENT. BLVD AMERICAS AV CANDILES A | DAFEMA INMOBILIARIA DE QUERÉTARO SA DE CV | CANDILES | 100% | 22/08/2016 | 16/10/2016 | 99% | 22/08/2016 | 31/12/2016 | | \$ 3,000,000.00 | \$ 2,971,106.50 | M2 PAVIMENTO | 11580 | | | |
| 62309 | OBRAS COMPLEMENTARIAS EDIFICIO DE SEGURIDAD - INSTALACIÓN EQUIPO CONTRA INCENDIO | GLOBAL INDUSTRIES SOLUTIONS SA DE CV | EL PUEBLITO | 100% | 10/10/2016 | 08/12/2016 | 96% | 10/10/2016 | 31/12/2016 | | \$ 1,600,000.00 | \$ 1,530,146.00 | PZA TARIERO PZA SENSOR PZA GENERADOR PZA MODULO PZA PANELP PZA ALARMA PZA EXTINTOR | 1 77 12 24 3 8 22 | | | |
| EMPRESTITO 2014 | | | | | | | | | | | TOTALES | \$ 81,224,140.59 | \$ 45,460,853.36 | | | | |

LIC. MA. E. YETSI BELTRÁN VALDERRÉAL
 DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
 SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

LIC. JUAN ANTONIO SOTELO ORTEGA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DE LA
 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".




ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE ABRIL DE 2017

| PERIODO: | ENTIDAD: | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | | | | | | | | | | INVERSIÓN | | METAS | | |
|--------------|----------|---|-----------|---|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|--|--|--------------------|------------------------------|------------------|-----------|--|
| | | FÍSICO | | | | | FINANCIERO | | | | | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | Unidad de Medida | Aprobadas | |
| MUNICIPIO: | | | | | | | | | | | | Total | Total | | | |
| No. De Obra | | Description | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | | | | | | | |
| 601168 | | (PRODERMAGICO) MUSEO ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO | | | | | | | | | | \$ | \$ | | | |
| PODER MAGICO | | | | | | | | | | | | TOTALES | \$ | \$ | | |
| | | | | | | | | | | | | | \$ | \$ | | |
| | | | | | | | | | | | | | \$ | \$ | | |


 LIC. MA. E. YETZI BELTRÁN VILLARREAL
 DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
 SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


 ARCÁNGEL ANTONIO SOTO ORTEGA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA DE LA
 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



| PERIODO: | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | | | | | | | | | | INVERSIÓN | | METAS | | |
|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|---|--|------------|--------------|---------------|--------------------|------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------|--------|
| | ENTIDAD: | MUNICIPIO: | FÍSICO | | | FINANCIERO | | | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | Unidad de Medida | Aprobadas | | | |
| ABRIL | QUERÉTARO | CORREGIDORA QUERÉTARO | Localidad | Contratista | Descripción | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | | |
| 60134 | | | EL PUEBLITO | ROKAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | BAÑOS TEATRO POPULAR EL PUEBLITO | 0% | 14/12/2015 | 12/03/2016 | 0% | 14/12/2015 | | \$ 1,350,000.00 | \$ | PZA BIODIGESTOR | 1 |
| 60177 | | | CORREGIDORA | (SIN CONTRATO) | APERTURA Y AFECTACION DE CALLE AHUEHUETE | 0% | | | | | | \$ 400,000.00 | \$ | PZA TINACO | 2 |
| 619988 | | | LA NEGRETA | ARMI ARQUITECTURA SA DE CV | CENTRO DE DESARROLLO HUMANO JARDINES DE LA NEGRETA | 100% | 31/07/2015 | 09/10/2015 | 87% | 31/07/2015 | | \$ 2,830,009.00 | \$ 2,451,529.34 | PZA MUEBLES | 10 |
| 619989 | | | CORREGIDORA | GRUPO EMPRESARIAL GIMP SA DE CV | INSTALACION DE LUMINARIAS SENDEROS SEGUROS | 100% | 10/07/2015 | 09/09/2015 | 39% | 10/07/2015 | | \$ 393,701.16 | \$ 150,076.42 | M2 PISO | 216.27 |
| 601114 | | | CORREGIDORA | LUKASA CONSTRUCTORA | CONSTRUCCION OFICINAS Y ALMACEN AREA EVENTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL | 81% | 20/09/2017 | 30/04/2017 | 86% | 20/03/2017 | | \$ 600,000.00 | \$ 514,507.99 | M2 MURO | 125.61 |
| 601128 | | | LA NEGRETA | DURAN COLIN CESAR | MAC BANQUETAS Y GUARNICIONES, LA NEGRETA ZDA ETAPA | 100% | 01/11/2016 | 09/04/2017 | 100% | 01/11/2016 | 30/11/2016 | \$ 338,700.00 | \$ 338,700.00 | M2 LOSA | 23.09 |
| 601131 | | | LAS FLORES | CONSTRUCTORA LLODI SA DE CV | TRABAJOS DE VALIDAD CAMINO A LAS FLORES | 100% | 09/10/2016 | 11/12/2016 | 40% | 09/10/2016 | | \$ 650,000.00 | \$ 259,019.93 | PZA DE JUEGO | 1 |
| 601132 | | | LAS CUMBRES | JOSE ALONSO GARCIA RIOS | TORRENTERA PLUVIAL EN AVENIDA CUMBRES, DEL ROBLE | 100% | 20/12/2016 | 19/02/2017 | 96% | 20/12/2016 | | \$ 718,000.00 | \$ 689,311.16 | PZA DE BOTE | 3 |
| 601133 | | | EL PUEBLITO | GRUPO MR ARQUITECTOS S. DE R.L. DE C.V. | NICHO PARA IMAGEN EN PARQUE RIBERA DEL RIO | 100% | 16/02/2017 | 29/03/2017 | 84% | | | \$ 317,716.67 | \$ 268,242.96 | PZA LUMINARIAS | 45 |
| 601136 | | | VALLE DE SANTIAGO | GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV | URBANIZACION DE CALLES VALLE DE SANTIAGO | 100% | 23/12/2016 | 16/02/2017 | 100% | 23/12/2016 | | \$ 1,053,994.21 | \$ 1,053,994.21 | PZA DE EMPEDRADO | 589.82 |
| 601135 | | | EL PUEBLITO | ADELFO HUERTO GARCIA | BARBA COLMONT ZONA D BOMBAS AGUA CEA PARQUE LINEAL | 100% | 16/02/2017 | 17/03/2017 | 0% | | | \$ 42,889.64 | \$ | M DE TOPE | 9.40 |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | \$ 8,685,010.68 | \$ 5,725,392.01 | | |

GASTO DIRECTO 2015

LIC. MA. E. VETSI BELTRAN VILLARREAL
DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

LIC. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.



| PERIODO: | ENTIDAD: | MUNICIPIO: | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | | | | | | | | | | | | INVERSIÓN | | | METAS | |
|----------|-----------|-----------------------|---|--|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|------------------------------|------------------|-----------|------------------------------|---------------|------------------|-----------------|---------|--|
| | | | FÍSICO | | | FINANCIERO | | | Fecha Término | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | Unidad de Medida | Aprobadas | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | | Unidad de Medida | Aprobadas | | |
| | | | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | | | | | | Total | Total | | | | |
| 601148 | QUERÉTARO | CORREGIDORA QUERÉTARO | EL ROMERAL | SIN CONTRATO | | | 0% | | | | | | | | | | M2 DE EMPEDRADO | 589.82 | |
| 601149 | | | MAC TRABAJOS DE URBANIZACIÓN Y OBRAS MENORES EL ROMERAL | | | | 0% | | | | | | \$ | 1,000,000.00 | | | M DE TOPE | 9.40 | |
| 601127 | | | MAC TRABAJOS DE URBANIZACIÓN Y OBRAS MENORES COL VENEREMOS | OBRA CIVILES E HIDRÁULICAS, S.A. DE C.V. | | 28/09/2017 | 26% | 28/09/2017 | 19/06/2017 | | | 0% | | \$ | 1,200,000.00 | | M2 LIMAJOA | 250 | |
| 601128 | | | MAC BANQUETAS Y GUARNICIONES, LA NEGRETA 1RA ETAPA | JOSE ANTONIO ZUÑIGA OLVERA | | 12/10/2016 | 100% | 12/10/2016 | 22/12/2016 | | | 97% | | \$ | 400,000.00 | | PZA PROYECTO | 1 | |
| 601128 | | | MAC BANQUETAS Y GUARNICIONES, LA NEGRETA 2DA ETAPA | DURAN COLIN CESAR | | 01/11/2016 | 100% | 01/11/2016 | 09/01/2017 | | | 84% | | \$ | 61,300.00 | | M2 PINTURA | 838.94 | |
| 601138 | | | MAC TRABAJOS URBANIZACION TRAMO I LOS OLVERA | ARTURO FRANCO | | 15/11/2016 | 100% | 15/11/2016 | 26/12/2016 | | | 95% | | \$ | 500,000.00 | | M3 | 159.45 | |
| 601142 | | | CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN AVENIDA GOBERNADORES | RUBEN ALANIZ CARRANZA | | 21/10/2016 | 100% | 21/10/2016 | 01/12/2016 | | | 98% | | \$ | 2,531,100.00 | | M3 MURO | 75 | |
| 601143 | | | CONSTRUCCION DE AULA Y BAÑOS PRIMARIA BICENTENARIO | JOSE CARMEN MORALES HERNANDEZ | | 06/12/2016 | 84% | 06/12/2016 | 16/01/2017 | | | 58% | | \$ | 2,000,000.00 | | M2 PAVIMENTO | 2380 | |
| 601121 | | | INTERVENCION URBANA INTEGRAL EN VIALIDADES VALLE DORADO | CIMA ELECTRICO SA DE CV | | 06/07/2016 | 100% | 06/07/2016 | 27/09/2016 | | | 96% | | \$ | 484,907.25 | | M2 DE EMPEDRADO | 429.5 | |
| 601144 | | | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OFICINAS DE CATASTRO | SIN CONTRATO | | | 0% | | | | | 0% | | \$ | 420,000.00 | | KG PUENTE | 1544.24 | |
| 601146 | | | MAC TRABAJOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES TRAMO I | MIGUEL ANGEL MARTIN DOMINGUEZ | | 06/02/2017 | 100% | 06/02/2017 | 26/02/2017 | | | 98% | | \$ | 500,000.00 | | M TUBO | 1860 | |
| 601147 | | | MAC TRABAJOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES TRAMO II | LAMINAS PERFILES Y MANUFACTURAS, S DE R.L. DE C.V. | | 06/02/2017 | 100% | 06/02/2017 | 26/02/2017 | | | 92% | | \$ | 500,000.00 | | M2 DE BANQUETA | 630.43 | |
| 607005 | | | CENTENARIO DE LA CONSTITUCION DE 1917 DE LA SEDATU, VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA | SERGIO PUEBLA MEJIA | | 03/10/2016 | 100% | 03/10/2016 | 01/12/2016 | | | 100% | | \$ | 775,750.13 | | M2 ADOCKETO | 468.72 | |
| 634001 | | | CONSTRUCCION DE LA 1ER. ETAPA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CENTENARIO DE LA CONSTITUCION DE 1917 | DESARROLLO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. | | 19/11/2016 | 97% | 19/11/2016 | 31/12/2016 | | | 55% | | \$ | 994,349.83 | | M GUARNICION | 340 | |
| 601167 | | | REGEN VIAL, INCORPORACION Y AMPL. PITE VEHICULAR RIO MEDITERRANEO Y LAS TROJ | | | | | | | | | | | \$ | 18,992,657.32 | | M2 BANQUETA | 374 | |
| 601170 | | | GASTO DIRECTO 2016 | | | | | | | | | | | \$ | 3,000,000.00 | | M BARANDAL | 42.82 | |
| | | | TOTALES | | | | | | | | | | | \$ | 73,766,027.00 | | M3 PASTO | 2506.08 | |
| | | | | | | | | | | | | | | \$ | 30,953,093.94 | | M2 PASTO | 1167.63 | |
| | | | | | | | | | | | | | | \$ | 509.87 | | M2 MURO | 509.87 | |
| | | | | | | | | | | | | | | \$ | 481.25 | | M2 LOSA | 481.25 | |
| | | | | | | | | | | | | | | \$ | 601.75 | | M2 PISO | 601.75 | |
| | | | | | | | | | | | | | | \$ | 1492.99 | | M2 APLANADO | 1492.99 | |
| | | | | | | | | | | | | | | \$ | 1546.94 | | M2 PINTURA | 1546.94 | |

LIC. MA. E. YETSI BELTRAN VILARREAL
 DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
 SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

AJL. JUAN ANTONIO SOTO ARTEGA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE OBRA DE LA
 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.



| PERIODO: ENTIDAD: MUNICIPIO: | ABRIL QUERÉTARO CORREGIDORA QUERÉTARO | | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | | | | | | | | | | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | | METAS | |
|------------------------------------|---|-------------|--|-------------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------|------------------------------|---|--|--|
| | No. De Obra | Descripción | Localidad | Contratista | FÍSICO | | | FINANCIERO | | | Fecha Término | Inversión Aprobada Total | Inversión Ejercida Total | Unidad de Medida | Aprobadas | |
| | | | | | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | | | | | | |
| 601101 | REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD (VARIAS) | VARIAS | SIGA SOLUCIONES | 80% | 04/07/2016 | 31/10/2016 | 0% | 04/07/2016 | | | | \$ 2,498,105.15 | | M2 DE BANQUETA M2 DE EMPEDRADO M2 DE EMPEDRADO | 707.73 408.21 1998.54 | |
| 601114 | CONSTRUCCION OFICINAS ANEXAS A PRESIDENCIA MUNICI | | SIN CONTRATO | 81% | | | 0% | | | | | \$ 250,320.00 | | M2 DE MURO M2 DE LOSA M2 IMPERMEABILIZACION M2 DE FIRME M2 ADORNADO | 270.20 509.25 458.25 241.25 1159.62 1211.65 | |
| 601110 | IMPLANT ECOTECNOLOGIAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUM | CORREGIDORA | EDUARDO MARQUINA RODRIGUEZ | 100% | 04/07/2016 | 30/12/2016 | 94% | 04/07/2016 | | | | \$ 3,997,525.33 | 3,771,209.68 | PZA EDIFICIO | 1 | |
| 601119 | COLOCACION DE PUENTE PEATONAL LIBRIMTO SUR PONIENTE | LOURDES | CONSTRUCTORA COLUMBUS | 92% | 29/08/2016 | 16/01/2017 | 89% | 29/08/2016 | | | | \$ 2,997,962.57 | 2,662,610.62 | M DE TUBO M2 DE PAVIMENTO M2 DE BANQUETA PZA DE LUMINARIA | 240.00 1715.00 811.50 5 | |
| 601111 | MANTENIMIENTO EN VIALIDADES EN CORREGIDORA | CORREGIDORA | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS | 93% | 22/08/2016 | 28/05/2017 | 65% | 22/08/2016 | | | | \$ 5,383,903.66 | 5,505,218.95 | M2 PISO PZA LAMPARA M2 DE PISO M DE GUARNICION M2 DE BANQUETA | 1282.80 19 1196.00 245.30 495.13 | |
| 601124 | REUB LINEA D MEDIA TENSION ESC.JESUS ROMERO | | IPESI ELECTRICIFICACIONES S DEL DE CORREGIDORA | 100% | 14/10/2016 | 22/12/2016 | 95% | 14/10/2016 | | | | \$ 500,000.00 | 475,229.79 | | | |
| 601125 | CONSTRUCCION ARCOTECO COBAQ PLANTEL 3 | LOS OLIVERA | MARIO ALBERTO RAMIREZ GARCIA | 100% | 19/10/2016 | 13/12/2016 | 98% | | | | | \$ 1,500,000.00 | 1,475,531.15 | | | |
| 601129 | BOLSA PARA ATENDER CONTINGENCIAS DE INFIST PLUVIAL | CORREGIDORA | ARTURO FRANCO | 100% | 01/11/2016 | 12/12/2016 | 97% | 01/11/2016 | | | | \$ 500,000.00 | 485,744.42 | PZA PANELES | 240 | |
| 601134 | LIEMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS AREA ADJUNTA PRESID | | SIN CONTRATO | 0% | | | 0% | | | | | \$ 600,000.00 | | PZA DE MODULO | 6 | |
| 601135 | BARDA COINONT ZONA D BOMBAS AGUA CEA PARQUE LINEAL | | ADELFO HURTADO GARCIA | 100% | 16/02/2017 | 17/09/2017 | 82% | 16/02/2017 | | | | \$ 387,110.36 | 318,366.47 | PZA PUENTE | 1 | |
| 601131 | TRABAOS DE VALIDAD CAMINO A LAS FLORES | EL PUEBLITO | CONSTRUCTORA LLODI | 100% | 03/10/2016 | 11/12/2016 | 0% | 03/10/2016 | | | | \$ 6,000,000.00 | | M DE VALIDAD PZA MODULO PZA REHABILITACION | 150.00 1 1 | |
| 601139 | TRABAOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES TRAMO II | LOS OLIVERA | SALVADOR URBIGLIA NIEMBRO | 100% | 06/02/2017 | 05/09/2017 | 93% | 06/02/2017 | | | | \$ 500,000.00 | 464,142.77 | M2 PAVIMENTO M2 DE BACHO | 8099.97 1700.00 | |
| 601137 | DUCTERIA INSTALACIONES FIBRA OPTICA C PEDRO URTIAG | | ARTURO FRANCO | 100% | 16/02/2017 | 17/09/2017 | 99% | 16/02/2017 | | | | \$ 47,850.89 | 47,570.17 | M2 DE BANQUETA M2 DE PAVIMENTO | 22.50 320.00 1.38 30 | |
| 601136 | URBANIZACION DE CALLES VALLE DE SANTIAGO | CORREGIDORA | GUMO CONSTRUCCIONES | 100% | 23/12/2016 | 16/02/2017 | 91% | 23/12/2016 | | | | \$ 95,326.41 | 86,377.53 | M2 PISO PZA DE TORRE | 3305.94 3 | |
| 601141 | TRABAOS ADICIONALES ESCUELA OCTAVIO PAZ EL PORTICO | CORREGIDORA | GUMO CONSTRUCCIONES | 100% | 15/12/2016 | 12/02/2017 | 99% | 15/12/2016 | | | | \$ 247,509.44 | 244,767.69 | PZA TRANSFORMADO R 15KV PZA | 1 1 3 3 | |
| 601140 | PUYON EN TELEDA | CORREGIDORA | CRIBADOS Y TRITURADOS QUERETARO-BAJO | 0% | 23/03/2017 | 31/05/2017 | 0% | 23/03/2017 | | | | \$ 2,600,000.00 | | M DE TUBO M2 DE EMPEDRADO PZA DE BOCA | 32 86 1 1 | |
| 601145 | URBANIZACION DE CALLES PRADERA DE GUADALUPE | | SIN CONTRATO | 0% | | | 0% | | | | | \$ 2,074,465.86 | | KG CABLE | 663.23 | |



| PERIODO: | ABRIL | | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | | | | | | | | | | INVERSIÓN | | METAS | | | | |
|------------|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------------|---|------------|--------------------|--------------|------------------------------|------|------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|
| | ENTIDAD: | QUERÉTARO | FÍSICO | | FINANCIERO | | INVERSIÓN APROBADA | | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | | Unidad de Medida | Aprobadas | | | | | | | |
| MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO | | Localidad | Contratista | Descripción | MUNICIPIO: | No. De Obra | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas |
| 601101 | | | VARIAS | SIGA SOLUCIONES | REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD (VARIAS) | | | 04/07/2016 | 31/10/2016 | 84% | 04/07/2016 | 04/07/2016 | 0% | 04/07/2016 | 04/07/2016 | \$ 2,498,405.15 | | M2 DE BANQUETA | 707.73 |
| 601114 | | | | SIN CONTRATO | CONSTRUCCION OFICINAS ANEXAS A PRESIDENCIA MUNICIP | | | | | 81% | | | 0% | | | \$ 250,320.00 | | M2 DE MURO | 270.20 |
| 601110 | | | CORREGIDORA | EDUARDO MARQUINA RODRIGUEZ | IMPLMN ECOTECNOLOGIAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUM | | | 04/07/2016 | 30/12/2016 | 100% | 04/07/2016 | 04/07/2016 | 94% | 04/07/2016 | 04/07/2016 | \$ 3,997,525.33 | 3,771,209.68 | PZA EDIFICIO | 1 |
| 601119 | | | LOURDES | CONSTRUCTORA COLUMBUS | COLOCACION DE PUENTE PEATONAL LIBRMTO SUR PONIENTE | | | 29/08/2016 | 16/01/2017 | 92% | 29/08/2016 | 29/08/2016 | 89% | 29/08/2016 | 29/08/2016 | \$ 2,997,962.57 | 2,662,610.62 | M2 DE PAVIMENTO | 240.00 |
| 601111 | | | CORREGIDORA | AGACEL AGREGADOS Y ASPALTOS | MANTENIMIENTO EN VIALIDADES EN CORREGIDORA | | | 22/08/2016 | 28/05/2017 | 93% | 22/08/2016 | 22/08/2016 | 65% | 22/08/2016 | 22/08/2016 | \$ 5,383,903.66 | 3,505,218.95 | M2 DE PISO | 1282.80 |
| 601124 | | | CORREGIDORA | IPESI ELECTRIFICACIONES S DE L DE | REUB LINEA D MEDIA TENSION ESC JESUS ROMERO | | | 14/10/2016 | 22/12/2016 | 100% | 14/10/2016 | 14/10/2016 | 0% | 14/10/2016 | 14/10/2016 | \$ 500,000.00 | #REFI | M2 DE GUARNICION | 1196.00 |
| 601125 | | | LOS OLVERA | MARIO ALBERTO RAMIREZ GARCIA | CONSTRUCCION ARCOTECHO COBAQ PLANTEL 3 | | | 19/10/2016 | 13/12/2016 | 100% | 19/10/2016 | 13/12/2016 | 0% | 19/10/2016 | 13/12/2016 | \$ 1,500,000.00 | #REFI | M2 DE BANQUETA | 245.30 |
| 601129 | | | CORREGIDORA | ARTURO FRANCO | BOLSA PARA ATENDER COTINGENCIAS DE INFSTR PLUVIAL | | | 01/11/2016 | 12/12/2016 | 100% | 01/11/2016 | 12/12/2016 | 97% | 01/11/2016 | 12/12/2016 | \$ 500,000.00 | 485,744.42 | PZA PANELES | 240 |
| 601134 | | | | SIN CONTRATO | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS AREA ADJUNTA PRESID | | | | | 0% | | | 0% | | | \$ 600,000.00 | | PZA DE MODULO | 6 |
| 601135 | | | | ADELFO HURTADO GARCIA | BARDA COLINDM ZONA D BOMBAS AGUA CEA PARQUE LINEAL | | | 16/02/2017 | 17/03/2017 | 100% | 16/02/2017 | 16/02/2017 | 82% | 16/02/2017 | 16/02/2017 | \$ 387,110.36 | 318,366.47 | PZA PUENTE | 1 |
| 601131 | | | EL PUEBLITO | CONSTRUCTORA LLODI | TRABAJOS DE VIALIDAD CAMINO A LAS FLORES | | | 09/10/2016 | 11/12/2016 | 100% | 09/10/2016 | 09/10/2016 | 0% | 09/10/2016 | 09/10/2016 | \$ 6,000,000.00 | | M DE VIALIDAD | 150.00 |
| 601139 | | | LOS OLVERA | SALVADOR URRIOLA NIEMBRO | TRABAJOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES TRAMO II | | | 06/02/2017 | 05/03/2017 | 100% | 06/02/2017 | 05/03/2017 | 98% | 06/02/2017 | 05/03/2017 | \$ 500,000.00 | 464,143.77 | M2 PAVIMENTO | 8099.97 |
| 601137 | | | | ARTURO FRANCO | DUCTERIA INSTALACIONES FIBRA OPTICA C PEDRO URTIAG | | | 16/02/2017 | 17/03/2017 | 100% | 16/02/2017 | 17/03/2017 | 0% | 16/02/2017 | 17/03/2017 | \$ 47,890.89 | #REFI | M2 DE BANQUETA | 22.50 |
| 601136 | | | CORREGIDORA | GUMMO CONSTRUCCIONES | URBANIZACION DE CALLES VALLE DE SANTIAGO | | | 23/12/2016 | 16/02/2017 | 100% | 23/12/2016 | 16/02/2017 | 91% | 23/12/2016 | 16/02/2017 | \$ 95,326.41 | 86,377.53 | M2 PISO | 3505.94 |
| 601141 | | | CORREGIDORA | GUMMO CONSTRUCCIONES | TRABAJOS ADICIONALES ESCUELA OCTAVIO PAZ EL PORTICO | | | 15/12/2016 | 12/02/2017 | 100% | 15/12/2016 | 12/02/2017 | 98% | 15/12/2016 | 12/02/2017 | \$ 247,508.44 | 244,767.69 | PZA TRANSFORMADO | 3 |

Handwritten signature and date: 30/04/2017





ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE ABRIL DE 2017

| PERIODO: | ENTIDAD: | MUNICIPIO: | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | | | | | | INVERSIÓN | | METAS | | |
|----------------|--|------------|--------------------------|---|--------------|---------------|--------------------|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| | | | FÍSICO | | FINANCIERO | | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | Unidad de Medida | Aprobadas | | | |
| No. De Obra | Descripción | Localidad | Contratista | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | | |
| 60228 | TRABAJOS DE URB EN C VILLA ORO EN COL VILLA DORADA | | | | | | | | | \$ 170,956.72 | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | \$ 6,771,071.37 | \$ 6,599,055.30 | | |

FISM 2016


 LIC. MA. E. YETSI BELTRÁN VILLARREAL
 DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
 SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


 LIC. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA DE LA
 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".





ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 30 DE ABRIL DE 2017

| PERIODO: | ENTIDAD: | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | | | | | | | | | | INVERSIÓN | | METAS | | | | |
|-------------|--|--------------------------|--------------|---------------|---|--------------|---------------|---|--------------|---------------|-------|--------------------|------------------------------|--------------|------------------|--------------|--|--|
| | | FÍSICO | | | | | FINANCIERO | | | | | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | Total | Unidad de Medida | Aprobadas | | |
| | | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | | | | | | | |
| ABRIL | QUERÉTARO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. De Obra | Description | Localidad | Contratista | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60228 | TRABAJOS DE URB EN C VILLA ORO EN COL VILLA DORADA | | | | | | | | | | | | | \$ | 170,956.72 | | | |
| | | | | | | | | | | | | TOTALES | \$ | 6,771,071.37 | \$ | 6,599,055.30 | | |

FISM 2016


 LIC. MA. E. YETZI BELTRÁN VILLARREAL
 DIRECTORA DE EFECTOS DE LA
 SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS


 LIC. JUAN ANTONIO SOTO ORTEGA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA DE LA
 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



| PERIODO: | ENTIDAD: | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|--|--|-------------|---|------------|--------------|---------------|-----------|--------------|---------------|-------|-------|------------------|-------|--|
| | | FÍSICO | | | | FINANCIERO | | | INVERSIÓN | | | | | | | |
| MUNICIPIO: | | Localidad | | Contratista | % | | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | METAS | |
| | CORREGIDORA QUERÉTARO | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. De Obra | | Descripción | | | | | | | | | | | | | | |
| 60228 | | TRABAJOS DE URB EN C VILLA ORO EN COL VILLA DORADA | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | | \$ | 440,235.75 | | |
| FISM 2014 | | | | | | | | | | | | | \$ | 440,235.75 | | |

LIC. MA. E. YETSI BELTRÁN LLARREAL
 DIRECTORA DE EGRESOS DE LA
 SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARGEMAN ANTONIO SOTO ORTEGA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA DE LA
 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
