



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO:	DICIEMBRE														
ENTIDAD:	QUERÉTARO														
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO														
16215	15.- HABILITACIÓN DE BAÑOS CABILDO Y OFICINA REGIDORES.	GD 2013	EL PUEBLITO	FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN		METAS	
				100%	15/04/2015	21/07/2015	100%	15/04/2015	30/09/2016	\$	1,210,849.38	\$	1,210,849.38		MODULO 1
6109	BARDA PERIMETRAL PARQUE AMANECER BALVANERA	GD 2013	LOMAS DE BALVANERA	100%	06/03/2015	25/06/2015	100%	06/03/2015	30/09/2016	\$	831,630.39	\$	831,630.39	ML	
6118	CENTRO CULTURAL TEJEDA 2DA ETAPA	GD 2013	TEJEDA	100%	13/03/2015	07/05/2015	100%	13/03/2015	30/09/2016	\$	88,569.36	\$	88,569.36		
60184	BARDA COLINDANCIA PARQUE SAN CARLOS CON ZONA HAB	GD 2013	CORREGIDORA	100%	06/05/2016	02/06/2016	100%	06/05/2016	30/09/2016	\$	20,794.30	\$	20,794.30		
GASTO DIRECTO 2013												\$	2,151,843.43	\$	2,151,843.43

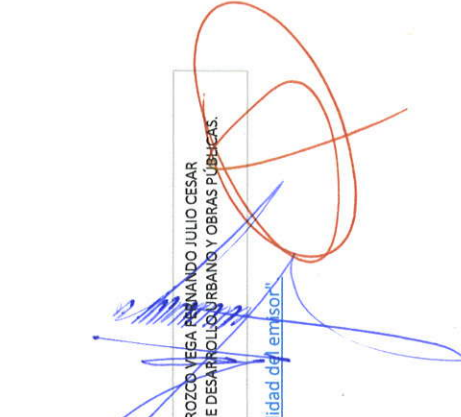
L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO										INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO										Total		Total	
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	FINANCIERO		Total		Unidad de Medida	Aprobadas
6102	VIVIENDA GASTO DIRECTO	GD 2014	SAN JOSE DE LOS OLIVERA	100%	30/05/2016	27/09/2016	97%	30/05/2016				\$ 1,000,000.00	\$ 977,218.41		
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD 2014	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	83%	03/07/2014				\$ 41,190,000.00	\$ 34,112,642.42	EDIFICIO	1
60184	BARDA COLINDANCIA PARQUE SAN CARLOS CON ZONA HAB	GD 2014	CORREGIDORA	100%	08/05/2016	02/06/2016	100%	08/05/2016	02/06/2016			\$ 347,369.31	\$ 347,369.31		
601137	DUCTERIA INSTALACIONES FIBRA OPTICA C PEDRO URTIAG	GD 2014	CORREGIDORA	0%			0%					\$ 102,149.11	\$ -		
GASTO DIRECTO 2014												\$ 42,639,518.42	\$ 35,437,230.14		


L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS


ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO										INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO										INVERSIÓN APROBADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
62301	ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	EMPRESTITO 2014	CANDILES	43%	22/06/2015	15/08/2015	21%	22/06/2015	22/06/2015		\$ 25,000,000.00	\$ 5,170,878.40	ALBERCA	1	
62302	PUENTE EN RIBERA DEL RIO	EMPRESTITO 2014	EL PUEBLITO	40%	22/06/2015	15/08/2015	22%	22/06/2015	22/06/2015		\$ 10,000,000.00	\$ 2,190,380.22	PUENTE	1	
62304	AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES ENTRONQUE A HUIMILPAN	EMPRESTITO 2014	SANTA BARBARA	100%	06/07/2015	15/08/2015	95%	06/07/2015	06/07/2015		\$ 10,000,000.00	\$ 9,548,989.37	AMPLIACION	1	
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	EMPRESTITO 2014	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	83%	03/07/2014	03/07/2014		\$ 20,000,000.00	\$ 16,563,555.37	edificio	1	
62307	EMPRESTITO REPAVIMENT AV. CANDILES	EMPRESTITO 2014	CANDILES	100%	22/08/2016	16/10/2016	100%	22/08/2016	22/08/2016	31/12/2016	\$ 7,500,000.00	\$ 7,485,797.50			
62308	2DA ETAPA REPAVIMENT. BLVD AMERICAS AV CANDILES A	EMPRESTITO 2014	CANDILES	100%	22/08/2016	16/10/2016	99%	22/08/2016	22/08/2016	31/12/2016	\$ 3,000,000.00	\$ 2,971,106.50			
62309	OBRAS COMPLE. EDI SEGURIDAD INST. CONTRA INCENDIO	EMPRESTITO 2014		100%	10/10/2016	08/12/2016	96%	10/10/2016	10/10/2016	31/12/2016	\$ 1,600,000.00	\$ 1,530,146.00			
EMPRESITTO 2014												\$ 77,100,000.00	\$ 45,460,853.36		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: ENTIDAD: MUNICIPIO:	PERIODO: DICIEMBRE QUERETARO	QUERETARO	AVANCE FISICO FINANCIERO										INVERSION		METAS	
No. De Obra	Descripción	FONDO	Localidad	FISICO			FINANCIERO			INVERSION APROBADA		INVERSION EJERCIDA ACUMULADA		Unidad de Medida	Aprobadas	
				%	Fecha Inicio	Fecha Termina	%	Fecha Inicio	Fecha Termina	Total	Total					
60119	PARRQUE (ILUMINACION, AREA VERDE Y ESCALERAS)	GD 2015	VALLE DORADO 2000	100%	28/08/2015	19/11/2015	100%	28/08/2015	18/09/2015	\$ 548,596.77	\$ 548,596.77	\$ 548,596.77	M2	210		
60122	CENTRO DE DESARROLLO HUMANO CHIARCO BLANCO	GD 2015	CHIARCO BLANCO	100%	10/09/2015	24/12/2015	100%	10/09/2015	24/12/2015	\$ 2,463,352.00	\$ 2,463,352.00	\$ 2,463,352.00	ML	400		
60134	BASOS TINTO POPULAR EL PUEBLITO	GD 2015	EL PUEBLITO	0%	14/12/2015	12/03/2016	0%	14/12/2015	14/12/2015	\$ 1,350,000.00	\$ -	\$ -	MODULO	1		
60156	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CON LOMAS DE BALVANERA	GD 2015	CORREGIDORA	100%	03/03/2016	11/04/2016	100%	03/03/2016	03/03/2016	\$ 828,801.71	\$ 828,801.71	\$ 828,801.71				
60177	ABERTURA Y PAVIMENTACION DE CALLE ANIHUETTE	GD 2015	CORREGIDORA	0%			0%			\$ 400,000.00	\$ -	\$ -				
60201	ALUMBRADO PUBLICO VARIOS COLOMAN	GD 2015	CORREGIDORA	100%	13/01/2016	09/01/2016	100%	13/01/2016	08/03/2016	\$ 1,103,763.71	\$ 1,103,763.71	\$ 1,103,763.71				
60294	COLOCACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL VALDEADRES	GD 2015	CORREGIDORA	100%	15/01/2016	11/02/2016	50%	15/01/2016	15/01/2016	\$ 1,576,469.53	\$ 838,489.37	\$ 838,489.37				
60195	PUENTE PEATONAL LIB SURITE MISION MARIANA TERA ETAPA	GD 2015	CORREGIDORA	100%	06/09/2016	28/07/2016	100%	06/09/2016	06/09/2016	\$ 1,887,774.25	\$ 1,887,774.25	\$ 1,887,774.25				
60196	TRABAJOS COMPLETOS OBRAS MENORES VIA PUBLICA	GD 2015	CORREGIDORA	100%	27/09/2016	21/07/2016	100%	27/09/2016	21/07/2016	\$ 297,774.25	\$ 297,774.25	\$ 297,774.25				
60297	COLOCACION BARRA JARDINES DE LA ESPERANZA	GD 2015	CORREGIDORA	100%	06/05/2016	28/07/2016	100%	06/05/2016	28/07/2016	\$ 299,530.00	\$ 299,530.00	\$ 299,530.00				
607001	PARQUE CRUZ DE FUEGO, CRUZ DE FUEGO	GD 2015	CORREGIDORA	100%	25/11/2015	30/12/2015	100%	25/11/2015	30/12/2015	\$ 967,267.05	\$ 967,267.05	\$ 967,267.05				
60786	REHABILIT BARRA PERIMETRAL Y REJA EN CANCHA	GD 2015	CORREGIDORA	100%	06/09/2016	02/06/2016	100%	06/09/2016	02/06/2016	\$ 208,941.85	\$ 208,941.85	\$ 208,941.85				
60789	REHABILITACION DREN LOS OLIVERA COJINAS BOSQUE	GD 2015	CORREGIDORA	99%	11/04/2016	05/06/2016	100%	11/04/2016	05/06/2016	\$ 211,135.92	\$ 211,135.92	\$ 211,135.92				
61988	CENTRO DE DESARROLLO HUMANO JARDINES DE LA NEGRETA	GD 2015	LA NEGRETA	69%	31/07/2015	09/10/2015	87%	31/07/2015	31/07/2015	\$ 2,430,009.00	\$ -	\$ 2,451,529.34				
61989	INSTALACION DE LUMINARIAS SENDEROS SEGUROS	GD 2015	CORREGIDORA	79%	10/07/2015	08/09/2015	0%	10/07/2015	10/07/2015	\$ 383,701.16	\$ -	\$ -				
607002	PREP 2015 PARQUE VIVO QUERETARO (EL BATANI)	GD 2015	CORREGIDORA	100%	19/12/2015	31/12/2015	100%	19/12/2015	31/12/2015	\$ 1,694,727.82	\$ 1,694,727.82	\$ 1,694,727.82				
606013	URBANIZACION CALLE JARDINES QRO LA NEGRETA	GD 2015	LA NEGRETA	100%	22/12/2015	31/12/2015	100%	22/12/2015	22/12/2015	\$ 159,793.79	\$ 159,793.79	\$ 159,793.79				
606014	URBANIZACION CALLE JARDINES DEL PEDREGAL	GD 2015	JARDINES DEL PEDREGAL	100%	19/12/2015	30/12/2015	100%	19/12/2015	19/12/2015	\$ 1,419,074.30	\$ 1,418,529.95	\$ 1,418,529.95				
606015	URBANIZACION CALLE JARDINES DE CORREGIDORA	GD 2015	CORREGIDORA	100%	22/12/2015	31/12/2015	100%	22/12/2015	22/12/2015	\$ 192,348.99	\$ 192,348.99	\$ 192,348.99				
606016	URBANIZACION CALLE 5 DE MAYO LA NEGRETA	GD 2015	LA NEGRETA	100%	19/12/2015	30/12/2015	100%	19/12/2015	19/12/2015	\$ 519,844.51	\$ 519,844.51	\$ 519,844.51				
60117	URBANIZACION CALLE 9 DE FEBRERO LA NEGRETA	GD 2015	LA NEGRETA	100%	19/12/2015	30/12/2015	100%	19/12/2015	21/06/2016	\$ 607,510.00	\$ 607,510.00	\$ 607,510.00				
60113	OBRAS DE CONTINGENCIAS Y MANTENIMIENTO PUJVAL	GD 2015	CORREGIDORA	100%	21/06/2016	29/08/2016	100%	21/06/2016	29/08/2016	\$ 3,500,000.00	\$ 3,498,346.81	\$ 3,498,346.81				
60113	MEJORAMIENTO DE VALDADES EN MARGEN DREN TELEFIA	GD 2015	TELEFIA	100%	08/06/2016	16/06/2016	100%	08/06/2016	16/08/2016	\$ 747,545.28	\$ 747,545.28	\$ 747,545.28				
60114	CONSTRUCCION DE VALDADES EN AREA FUENTES PRESI MANG	GD 2015	CORREGIDORA	0%	12/06/2016	07/06/2016	100%	12/06/2016	12/06/2016	\$ 4,807,156.54	\$ -	\$ -				
60115	URBANIZACION VALLE EN LATERAL CARRETERA 411	GD 2015	CORREGIDORA	100%	08/02/2016	30/08/2016	99%	08/02/2016	08/06/2016	\$ 746,169.91	\$ 733,344.03	\$ 733,344.03				
60116	PAVIMENTACION BOULEVARD DE LAS AMERICAS	GD 2015	LOMAS DE BALVANERA	100%	07/03/2016	11/04/2016	100%	07/03/2016	01/03/2016	\$ 828,801.71	\$ 828,801.71	\$ 828,801.71				
60156	TRABAJOS COMPLETOS LOMAS BALVANERA	GD 2015	JUAN ALDAMA	100%			100%			\$ 136,796.07	\$ 136,796.07	\$ 136,796.07				
6104	GD 2014 COMPLEMENTO ALIA DIDACTICA SEC JUAN ALDAMA	GD 2015	LA NEGRETA	100%	01/11/2016	09/01/2017	100%	01/11/2016	30/11/2016	\$ 338,700.00	\$ 338,700.00	\$ 338,700.00				
601128	MAC BANQUETAS Y GUARNICIONES LA NEGRETA 2DA ETAPA	GD 2015	LAS FLORES	0%			0%			\$ 650,000.00	\$ -	\$ -				
60131	TRABAJOS DE VALDADES CAMINO A LAS FLORES	GD 2015	LAS FLORES	0%			0%			\$ 710,000.00	\$ -	\$ -				
60132	TORRENTERA PUJVAL EN AVENIDA CUMBRES, DEL NOBLE	GD 2015	LAS CUMBRES	0%			0%			\$ 317,716.67	\$ -	\$ -				
60133	NICHO PARA IMAGEN EN PARQUE LIBERIA DEL RIO	GD 2015	EL PUEBLITO	0%			0%			\$ 1,053,994.21	\$ -	\$ -				
60136	URBANIZACION DE CALLES VALLE DE SANTIAGO	GD 2015		0%			0%			\$ 42,889.64	\$ -	\$ -				
60135	BARRA COORDINADORA ZONA BOMBAS AGUA CEA PARQUE LINEAL	GD 2015		0%			0%			\$ 111,476.65	\$ -	\$ -				
60123	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL VALDADES	GD 2015		100%			99%			\$ 111,476.65	\$ 110,871.35	\$ 110,871.35				
GASTO DIRECTO 2015											\$ 34,035,519.64	\$ 27,983,169.77				

A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO FERRANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE INGENIERIA Y OBRAS
PUBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO:	DICIEMBRE										
ENTIDAD:	QUERETARO										
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERETARO										
		AVANCE FISICO FINANCIERO				INVERSION					
No. De Obra	Descripción	FONDO	Localidad	FISICO		FINANCIERO		INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
				%	Fecha Inicio	Fecha Terminó	%			Fecha Inicio	Fecha Terminó
601100	INTERVENCIÓN RV URB INTEGRAL EN VALDADES, PURISIM SAN RAFAEL	GD 2016	SAN RAFAEL	99%	16/05/2016	07/08/2016	100%		16/05/2016	\$ 1,949,782.93	\$ 1,949,782.93
601101	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD (VARIAS)	GD 2016	CORREGIDORA	23%	04/07/2016	31/10/2016	0%			\$ 2,498,105.15	\$ -
601102	ACCESOS A SECUNDARIA TECNICA JUAN ALDAMA LOS ANGELES	GD 2016	CORREGIDORA	100%	25/05/2016	21/09/2016	99%		25/05/2016	\$ 2,458,420.24	\$ 2,458,420.24
601103	ACCESOS A SECUNDARIA TECNICA JUAN ALDAMA LOS ANGELES	GD 2016	LOS ANGELES	100%	06/05/2016	28/07/2016	100%		06/05/2016	\$ 1,958,724.92	\$ 1,958,724.92
601104	ACCESO SECUNDARIA JESUS ROMERO FLORES SNTA	GD 2016	CORREGIDORA	100%	12/05/2016	17/08/2016	98%		12/05/2016	\$ 4,843,369.86	\$ 4,743,580.10
601105	ACCESO SECUNDARIA JESUS ROMERO FLORES SNTA	GD 2016	CORREGIDORA	100%	12/10/2016	20/12/2016	98%			\$ 3,000,000.00	\$ 2,974,896.48
601106	IMPULSAM ECOTECNOLOGIAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUMIN	GD 2016		82%	04/07/2016	30/12/2016	70%			\$ 3,987,525.33	\$ 2,791,441.14
601107	COLOCACION DE ESPACIOS RED CARGA ELECTRICA VEHICUL	GD 2016		98%	04/07/2016	23/10/2016	88%		04/07/2016	\$ 989,888.00	\$ 872,877.59
601108	COLOCACION DE PUENTE PEATONAL LIBRITO SUR PONIENTE COM	GD 2016	LOURDES		29/08/2016	16/01/2017	65%			\$ 2,997,962.57	\$ 1,950,152.83
601109	INTER URB INTEGRAL EN VALDADES, PUERTA SAN RAFAEL	GD 2016	SAN RAFAEL	100%	25/05/2016	22/08/2016	100%		25/05/2016	\$ 3,471,010.56	\$ 3,471,010.56
601110	MANTENIMIENTO EN VALDADES EN CORREGIDORA	GD 2016	CORREGIDORA	58%	22/08/2016	28/05/2017	25%			\$ 5,883,903.66	\$ 1,822,593.31
601111	MANTENIMIENTO EN VALDADES CALLE PERASSO, SNT BARBAR	GD 2016	SANTA BARBARA	100%	28/07/2016	07/08/2016	100%		28/07/2016	\$ 243,803.14	\$ 243,803.14
601112	CONCRETO ESTAMPADO CALLE ANDAMAXE COL SANTUARIOS	GD 2016	SANTUARIOS DEL PUEBLITO	100%	22/08/2016	13/11/2016	100%		22/08/2016	\$ 5,477,381.72	\$ 5,474,367.73
601113	INT URB VALDADES VALLE DORADO 2000 ELEC, LUMIN	GD 2016	VALLE DORADO	100%	08/07/2016	27/09/2016	98%			\$ 484,307.25	\$ 467,599.22
601114	SOLUCION PLUVIAL CALLE FELIPE SEVILLA CANDILES	GD 2016	CANDILES	100%	22/08/2016	18/09/2016	85%			\$ 295,994.80	\$ 262,442.98
601123	REUB LINEA D MEDIA TENSION ESC JESUS ROMERO FLORES	GD 2016	SANTA BARBARA	100%	14/10/2016	22/12/2016	85%			\$ 500,000.00	\$ 480,348.19
601125	CONSTRUCCION ARCOTECHO COBAQ PLANTEL 3 LOS OLIVERA	GD 2016	LOS OLIVERA	62%	18/10/2016	13/12/2016	24%			\$ 1,500,000.00	\$ 365,379.22
601129	BOLSA PARA ATENDER COTINGENCIAS DE INFRASTRUCTURA	GD 2016	CORREGIDORA	62%			97%			\$ 500,000.00	\$ 484,835.02
601127	MAC BANQUETAS Y GUARNICIONES, LA NEGRETA 1RA ETAPA	GD 2016	LA NEGRETA	100%	12/10/2016	22/12/2016	97%			\$ 400,000.00	\$ 387,981.14
601128	MAC BANQUETAS Y GUARNICIONES, LA NEGRETA 2DA ETAPA	GD 2016	LA NEGRETA	100%	01/11/2016	09/01/2017	84%			\$ 61,300.00	\$ 51,222.50
601134	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS AREA AJUNTA PRESID	GD 2016		0%			0%			\$ 600,000.00	\$ -
601135	BARDA COLINDM ZONA D BOMBAS AGUA CEJA PARQUE LINEAL	GD 2016		0%			0%			\$ 387,110.36	\$ -
601130	CONSTR MURO COLINDANCIA COMP EN RENAB DE RIO PUEBL	GD 2016		100%	08/11/2016	18/12/2016	99%			\$ 700,000.00	\$ 689,304.02
601131	TRABAJOS DE VALDADES CAMINO A LAS FLORES	GD 2016	LAS FLORES	0%			0%			\$ 6,000,000.00	\$ -
601138	MAC TRABAJOS URBANIZACION TRAMO I LOS OLIVERA	GD 2016	LOS OLIVERA	98%			99%			\$ 500,000.00	\$ 496,928.31
601139	MAC TRABAJOS URBANIZACION TRAMO II LOS OLIVERA	GD 2016	LOS OLIVERA	0%			0%			\$ 500,000.00	\$ -
601137	DUCTERIA INSTALACIONES FIBRA OPTICA C PEDRO URTIAS	GD 2016		0%			0%			\$ 47,850.89	\$ -
601136	URBANIZACION DE CALLES VALLE DE SANTIAGO	GD 2016		0%			0%			\$ 95,326.41	\$ -
601141	TRABAJOS ADICIONALES ESCUELA OCTAVIO PAZ EL PORTICO	GD 2016		0%	15/12/2016	12/02/2017	0%			\$ 247,509.44	\$ -
601140	PUYON EN TEJEDA	GD 2016		0%			0%			\$ 890,000.00	\$ -
601142	CONSTRUCCION DE VALDADES EN AVENIDA GOBERNADORES	GD 2016		100%			98%			\$ 2,531,100.00	\$ 2,468,431.55
601145	URBANIZACION DE CALLES PRADERA DE GUADALUPE	GD 2016								\$ 2,074,465.86	\$ -
601144	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OFICINAS DE CATASTRO	GD 2016								\$ 420,000.00	\$ -
601143	CONSTRUCCION DE ALUJAS Y BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA	GD 2016								\$ 2,000,000.00	\$ 207,338.56
601146	MAC TRABAJOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES TRAMO I	GD 2016	LOS ANGELES							\$ 500,000.00	\$ -
601147	MAC TRABAJOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES TRAMO II	GD 2016	LOS ANGELES							\$ 500,000.00	\$ -
601148	MAC TRABAJOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES EL ROMERAL	GD 2016	EL ROMERAL							\$ 1,000,000.00	\$ -
601149	MAC TRABAJOS DE URBANIZACION Y OBRAS MENORES COL VENCEREMOS	GD 2016	VENCEREMOS							\$ 1,200,000.00	\$ -
										\$ 63,217,153.67	\$ 36,377,465.69

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JUNIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:												INVERSIÓN APROBADA		Unidad de Medida	
MUNICIPIO:												INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	FINANCIERO		Total	Total	Aprobadas	
60223	MEJORAMIENTO DE CALLES VILLA DORADA (FISM 2009-2010-2011-2013-2014-2015)	FISM 2015	CORREGIDORA	100%	27/05/2016	21/07/2016	60%	27/05/2016	21/07/2016			\$ 69,928.59	\$ 69,928.59		
60227	URBANIZACION EN VILLA DORADA	FISM 2015	Villa Dorada	100%	25/11/2016	02/02/2017	100%					\$ 678,085.47	\$ 678,085.47		
FISM 2015												\$ 748,014.06	\$ 748,014.06		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO:	AVANCE FISICO FINANCIERO										INVERSION		METAS				
ENTIDAD:											INVERSION APROBADA		INVERSION EJERCIDA ACUMULADA				
MUNICIPIO:											INVERSION APROBADA		INVERSION EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripcion	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Termino	%	Fecha Inicio	Fecha Termino	FINANCIERO		INVERSION APROBADA		INVERSION EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
												Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
60223	MEJORAMIENTO DE CALLES VILLA DORADA (FISM 2009-2010-2011-2013-2014-2015)	FISM 2014	CORREGIDORA	100%	27/05/2016	21/07/2016	60%	27/05/2016	21/07/2016			347,704.97	\$	347,704.97			
60227	URBANIZACION EN VILLA DORADA	FISM 2014	Villa Dorada	0%	25/11/2016	02/02/2017	23%					\$	676,021.74	\$	152,334.95		
FISM 2014												\$	1,023,726.71	\$	500,039.92		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO:	DICIEMBRE	AVANCE FISICO FINANCIERO										INVERSION		METAS	
ENTIDAD:	QUERETARO											INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERETARO	FISICO										FINANCIERO			
No. De Obra	Description	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Termino	%	Fecha Inicio	Fecha Termino			Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60223	MEJORAMIENTO DE CALLES VILLA DORADA (FISM 2009-2010-2011-2013-2014-2015)	FISM 2013	CORREGIDORA	100%	27/05/2016	21/07/2016	60%	27/05/2016	21/07/2016			\$	17,264.48	\$	17,264.48
60227	URBANIZACION EN VILLA DORADA	FISM 2013	Villa Dorada	0%	25/11/2016	02/02/2017	15%					\$	75,113.01	\$	11,119.30
FISM 2013												\$	92,377.49	\$	28,383.78

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"





 L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
 SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:	DICIEMBRE											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO											
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS
60223	MEJORAMIENTO DE CALLES VILLA DORADA (FISM 2009-2010-2011)	FISM 2009,2010,2011	CORREGIDORA	100%	27/05/2016	21/07/2016	80%	27/05/2016	21/07/2016	\$ 11,096.14	\$ 11,096.14	Unidad de Medida
										\$ 11,096.14	\$ 11,096.14	Aprobadas
FISM												



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: DICIEMBRE		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD: QUERÉTARO												INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO												INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Fecha Término		Total		Total	Unidad de Medida
60224	URBANIZACIÓN DE CALLES EN VILLA DORADA	FISM 2016	Villa Dorada	100%	25/09/2016	03/12/2016	100%					\$ 983,053.20	\$	981,993.85	
60225	DRENAJE PRADERAS DE GUADALUPE	FISM 2016	Praderas de Guadalupe	85%	25/09/2016	15/01/2017	100%					\$ 4,587,581.60	\$	4,570,499.95	
60226	AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO COL. AMP LOS ANGELES	FISM 2016	Los Angeles	100%	25/09/2016	27/12/2016	100%					\$ 983,053.20	\$	980,330.22	
60227	URBANIZACIÓN EN VILLA DORADA	FISM 2016	Villa Dorada	0%	25/11/2016	02/02/2017	0%					\$ 6,231.28	\$	-	
60222	INDIRECTOS	FISM 2016	CORREGIDORA	0%			100%					\$ 60,000.00	\$	60,000.00	
FISM 2016												\$ 6,619,919.28	\$	6,592,824.02	

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:		FÍSICO										INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		Aprobadas	
MUNICIPIO:		FINANCIERO										INVERSIÓN APROBADA		Unidad de Medida	
No. De Obra	Descripción	FONDO	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
630001	MEJORAMIENTO DE VIALIDAD Y URBANIZACIÓN MISION SAN CARLOS	FORTALECE 2016	CORREGIDORA	100%	09/06/2016	03/08/2016	100%	09/06/2016	31/12/2016	\$ 3,587,861.61	\$ 3,587,861.61	\$ 3,587,861.61	\$ 3,587,861.61		
630002	AMPLIACION CARRIL DE ACCESO A COMUNIDAD ZONA SUR LOS OLIVERA	FORTALECE 2016	CORREGIDORA	98%	09/06/2016	31/08/2016	100%	09/06/2016	31/12/2016	\$ 9,298,168.24	\$ 9,298,168.24	\$ 9,298,168.24	\$ 9,298,168.24		
630003	MEJORAMIENTO DE VIALIDADES Y URBANIZACION SANTA BARBARA	FORTALECE 2016	CORREGIDORA	100%	09/06/2016	03/08/2016	100%	09/06/2016	31/12/2016	\$ 5,922,670.72	\$ 5,922,670.72	\$ 5,922,670.72	\$ 5,922,670.72		
630004	MEJORAMIENTO DE CALLES CANDILES	FORTALECE 2016	CORREGIDORA	100%	30/06/2016	10/08/2016	100%	30/06/2016	31/12/2016	\$ 2,829,799.67	\$ 2,829,799.67	\$ 2,829,799.67	\$ 2,829,799.67		
630005	MEJORAMIENTO DE ACCESO A LOS OLIVERA	FORTALECE 2016	CORREGIDORA	95%	04/07/2016	25/09/2016	100%	04/07/2016	31/12/2016	\$ 3,461,284.72	\$ 3,461,284.72	\$ 3,461,284.72	\$ 3,461,284.72		
630006	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL MISION MARIANA	FORTALECE 2016	CORREGIDORA	100%	09/06/2016	31/08/2016	95%	09/06/2016	31/12/2016	\$ 4,687,282.40	\$ 4,687,282.40	\$ 4,687,282.40	\$ 4,687,282.40		
FORTALECE 2016												\$ 29,787,067.36	\$ 29,787,067.36		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:		CORREGIDORA QUERÉTARO										INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO										INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término						
63301	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA,COM LA POZA	FISE 2016		100%	25/08/2016	07/12/2016	76%	25/08/2016		\$	3,735,000.00	\$	2,853,746.04		
63302	CONSTRUCCION 1RA ETAPA RED DRENAJE COL ARBOLEDAS S	FISE 2016		100%	25/08/2016	07/12/2016	96%	25/08/2016		\$	2,171,920.40	\$	2,095,775.17		
63303	INTRO RED D DRENAJE SANITARIO COL AMPL LOS ANGELES	FISE 2016		44%	07/10/2016	17/11/2016	93%	07/10/2016		\$	1,149,579.53	\$	1,070,503.19		
FISE 2016											\$	7,055,499.93	\$	6,020,024.40	

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:		CORREGIDORA QUERÉTARO										INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO										INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Fecha Término		Total	Total	Total	Unidad de Medida
615001	URBANIZACION VIALIDADES LUIS DONALDO COLOSIO	DES REGIONAL 2016		45%	30/11/2016	21/02/2017	0%	30/11/2016				\$ 2,373,600.00	\$ 1,514,228.59		Aprobadas
615002	MEJORAMIENTO DE VIALIDADES SAN JOSE DE LOS OLIVERA	DES REGIONAL 2016		30%	30/11/2016	10/02/2017	0%	30/11/2016				\$ 2,967,000.00	\$ 1,382,680.27		
615003	MEJORAMIENTO DE CALLES RIO BALSAS LA CUEVA	DES REGIONAL 2016		60%	30/11/2016	10/02/2017	0%	30/11/2016				\$ 989,000.00	\$ 499,637.18		
615004	INTRO DRENAJE Y CONTR DE BANQUETAS AV JOSEFA ORTIZ	DES REGIONAL 2016		75%	30/11/2016	24/02/2017	0%	30/11/2016				\$ 1,978,000.00	\$ 452,768.65		
DESARROLLO REGIONAL 2016												\$ 8,307,600.00	\$ 3,849,314.69		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: DICIEMBRE		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO														
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO														
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Fecha Término		Total		Unidad de Medida	Aprobadas
621001	PAVIMENTACION DE CALLE CAMINO REAL	PROGRAMAS REGIONALES 2016		5%	09/12/2016	17/02/2017	0%					\$ 4,137,506.36	0.00		
621002	PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES 5 DE MAYO, FCO IMAD	PROGRAMAS REGIONALES 2016		5%	09/12/2016	17/02/2017	0%					\$ 5,862,493.64	0.00		
PROGRAMAS REGIONALES 2016												\$ 10,000,000.00	\$		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO:	DICIEMBRE	AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS		
ENTIDAD:	QUERÉTARO											INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO	FÍSICO				FINANCIERO										
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas			
619494	REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN SANTA BARBARA (RECUPERACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS)	PRONAPRED 2016		100%	07/09/2016	29/11/2016	93%	07/09/2016	01/12/2016	\$ 2,500,000.00	\$ 2,329,456.60					
PRONAPRED 2016												\$ 2,500,000.00	\$ 2,329,456.60			

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS		
ENTIDAD:		QUERÉTARO										INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO														
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término							
606019	EMPEDRADO C/LE SNT MARIA D PUEBLITO, NEGRETA	HABITAT 2016		62%	18/10/2016	16/12/2016	100%	18/10/2016			\$ 3,382,010.00	\$ 3,382,010.00				
606020	EMPORDO AHOGADO EN MORTERO C/LE SAN FCO NGRT	HABITAT 2016		78%	19/10/2016	17/12/2016	100%	19/10/2016			\$ 1,849,126.00	\$ 1,849,126.00				
VERTIENTE HABITAT FEDERAL 2016												\$ 5,231,136.00	\$ 5,231,136.00			

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:		FÍSICO										INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO:		FINANCIERO										Total		Total	
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Unidad de Medida	Aprobadas				
606019	ME001 EMPEDRADO CLE SNT MARIA D PUEBLITO, NEGRETA	HABITAT 2016		62%	18/10/2016	16/12/2016	100%	18/10/2016				\$	2,659,436.00	\$	2,659,436.00
606020	ME002 EMPORDO AHOAGADO EN MORTERO CLE SAN FCO NGRT	HABITAT 2016		78%	19/10/2016	17/12/2016	100%	19/10/2016				\$	1,637,514.00	\$	1,637,514.00
VERTIENTE HABITAT MUNICIPAL 2016												\$	4,296,950.00	\$	4,296,950.00

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO:	DICIEMBRE											
ENTIDAD:	QUERÉTARO											
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO											
	FÍSICO					FINANCIERO			INVERSIÓN		METAS	
									INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida
607003	PARQUE COLONIAL	PREP 2016		90%	03/10/2016	01/12/2016	100%	03/10/2016		\$ 1,000,000.00	\$ 998,768.88	
607004	PARQUE VILLA CANO	PREP 2016		80%	03/10/2016	01/12/2016	98%	03/10/2016		\$ 1,000,000.00	\$ 978,545.54	
607005	PARQUE CENTENAR DE LA CONST 1917	PREP 2016		41%	03/10/2016	01/12/2016	73%	03/10/2016		\$ 1,500,000.00	\$ 1,093,109.05	
VERTIENTE PREP FEDERAL 2016												
										\$ 3,500,000.00	\$ 3,070,423.47	



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO:												INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO:		FÍSICO										FINANCIERO			
No. De Obra	Descripcion	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
607003	PARQUE COLONIAL	PREP 2016		90%	03/10/2016	01/12/2016	100%	03/10/2016		\$ 1,032,287.74	\$ 1,031,016.86				
607004	PARQUE VILLA CANO	PREP 2016		80%	03/10/2016	01/12/2016	98%	03/10/2016		\$ 1,024,793.91	\$ 1,002,807.49				
607005	PARQUE CENTENAR DE LA CONST 1917	PREP 2016		41%	03/10/2016	01/12/2016	73%	03/10/2016		\$ 1,811,501.74	\$ 1,320,112.62				
VERTIENTE PREP MUNICIPAL 2016												\$ 3,868,583.39	\$ 3,353,936.97		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO										INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO										INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término						
634001	CONSTRUCION ETAPA CDC CONSTIT 1917 EQUIP DE COSTURA	PROGRAMA INFRA. BASICA Y COMPLEMENTARIA		17%	19/11/2016	31/12/2016	0%					\$ 2,039,734.50		0.00	
634002	EQUIP CDC CENT CONSTIT 1917 SALON DE COMPUTO	PROGRAMA INFRA. BASICA Y COMPLEMENTARIA		0%			0%					\$ 358,918.00		0.00	
HABITAT PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y COMPLEMENTARIA FEDERAL 2016												\$ 2,398,652.50	\$		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN	
ENTIDAD:		QUERÉTARO										INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERÉTARO										METAS	
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
634001	CONSTRUC 1ER ETPA CDC CONSTIT 1917 EQUIP DE COSTURA	PROGRAMA INFRA. BASICA Y COMPLEMENTARIA		17%	19/11/2016	31/12/2016	0%			\$ 2,099,734.50		0.00	
634002	EQUIP CDC CENT CONSTIT 1917 SALON DE COMPUTO	PROGRAMA INFRA. BASICA Y COMPLEMENTARIA		0%			0%			\$ 358,918.00		0.00	
HABITAT PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y COMPLEMENTARIA MUNICIPAL 2016											2,398,652.50		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

PERIODO:	DICIEMBRE	AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		
ENTIDAD:	QUERÉTARO													
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		
No. De Obra	Descripcion	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
63101	3X1 REHABILITACION DE PLAZA CIVICA LOURDES	3X1 al Migrante (aportación Estatal, Federal y Club de Migrantes.		90%	03/10/2016	01/12/2016	100%	03/10/2016		\$ 1,550,000.00	\$ 1,549,274.89			
										\$	1,550,000.00	\$	1,549,274.89	

PROGRAMA 3X1 AL MIGRANTE



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: DICIEMBRE		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSION		METAS	
ENTIDAD: QUERÉTARO												INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO															
No. De Obra	Description	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
61305	CONSTRUCCION ARCO TECHO PLAZA PUBLICA LA CUEVA	GEQ 2016 CAPITAL	LA CUEVA	0%			0%					\$ 1,256,262.50	\$ -		
61304	REHABILITACION ESPACIO DEPORTIVO UNID DEPORTIVA UAQ	GEQ 2016 CAPITAL		0%			0%					\$ 1,743,737.49			
61303	BARDA DE ACCESO DE ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO	GEQ 2016 CAPITAL		0%			0%					\$ 1,500,000.00			
GEQ 2016												\$ 4,499,999.99	\$ -		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

"Rajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.
