

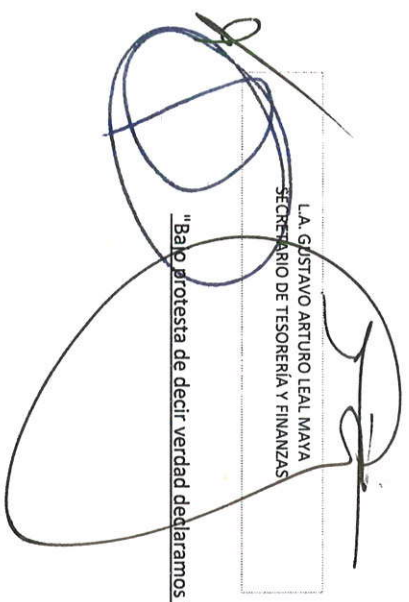


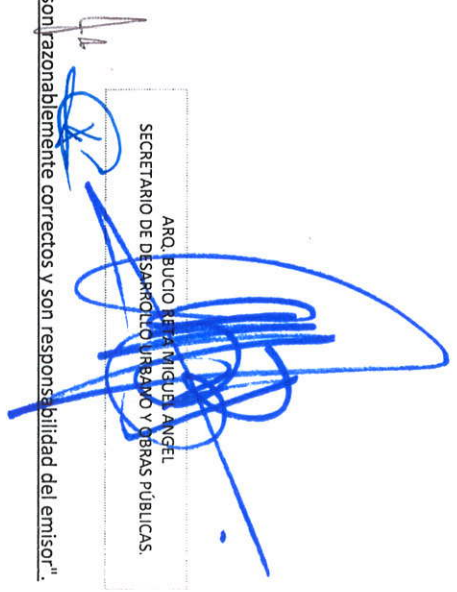
CORREGIDORA
CIUDADANA

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 29 de febrero 2016

PERIODO:	FEBRERO												
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSION					
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSION APROBADA		INVERSION EJERCIDA		METAS			
No. De Otra	Descripción	Fondo	Localidad	Fecha		Fecha		Fecha		Unidad de			
				%	Término	%	Término	%	Término	Total	Total	Medida	Aprobadas
6217	ELECTRIFICACION DE CALLES, LOMAS DE CHARCO BLANCO	FISM 2013	MUNICIPIO	100%	06/08/2015	21/10/2015	93%	06/08/2015	21/10/2015	1,003,721.65	930,149.26	OBRA	1
FISM 2013										1,003,721.65	930,149.26		


L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS


ARQ. BUNCIO RETA NIGUEL ÁNGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



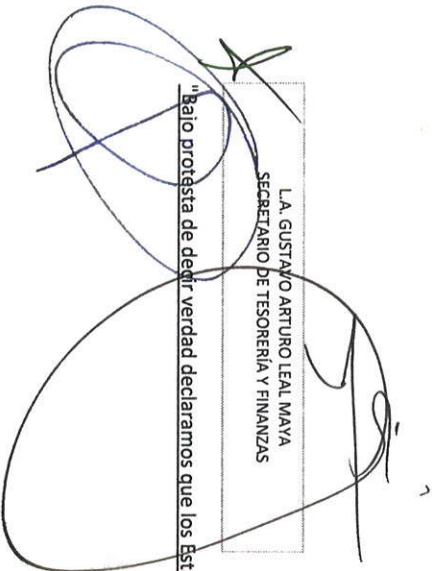
PERIODO:	FEBRERO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO				INVERSIÓN							
ENTIDAD:	QUERETARO	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	METAS					
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERETARO												
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
6101	ANDADORES EN SAN JOSE DE LOS OLIVERA	GD 2014	SAN JOSE DE LOS OLIVERA	100%	19/12/2014	18/03/2015	97%	19/12/2014	18/03/2015	1,941,767.48	1,880,135.53	M2	
6102	VIVIENDA GASTO DIRECTO	GD 2014	SAN JOSE DE LOS OLIVERA	0%	-	-	0%			1,000,000.00	-		
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD 2014	EL PUEBLITO	71%	03/07/2014	30/07/2015	44%	03/07/2014	30/07/2015	41,190,000.00	18,292,682.63	EDIFICIO	1
6119	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA EL EDIFICIO DE SEGURIDAD	GD 2014		100%	30/03/2015	12/09/2015	95%	30/03/2015	12/09/2015	1,836,000.00	1,745,999.98	PROYECTO	1
6120	BOLSA PARA SUPERVISIÓN EXTERNA	GD 2014		N/A	30/03/2015	12/09/2015	67%	30/03/2015	12/09/2015	3,165,003.88	2,128,604.59	PROYECTO	1
DIRECTO 2014										49,132,771.36	24,047,422.73		

LA GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

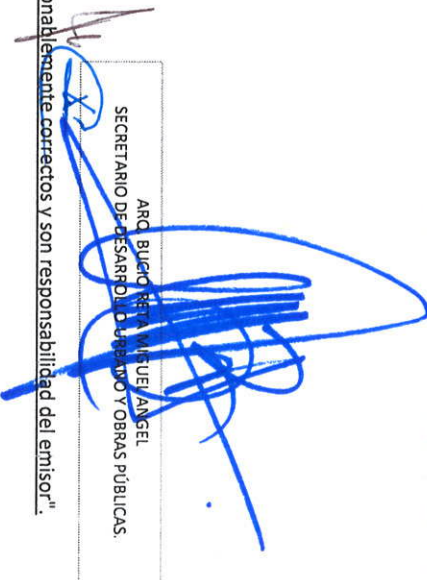
ARO. BUCIL DE A MIGUEL ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PERIODO:	FEBRERO		AVANCE FISICO FINANCIERO				INVERSION																			
ENTIDAD:	QUERETARO		FISICO		FINANCIERO		INVERSION APROBADA		INVERSION EJERCIDA ACUMULADA																	
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERETARO								METAS																	
No. De Obra	Descripcion		Fondo		Localidad		%		Fecha Inicio		Fecha Termino		%		Fecha Inicio		Fecha Termino		Total		Total		Unidad de Medida		Aprobadas	
6208	ELECTRIFICACION DE CALLES PUERTA DE SAN RAFAEL		FISM 2014		PUERTA DE SAN RAFAEL		100%		08/04/2015		02/06/2015		48%		08/04/2015		02/06/2015		350,000.00		167,421.77		OBRA		1	
6209	ELECTRIFICACION DE CALLES PURISIMA		FISM 2014		LA PURISIMA		100%		08/04/2015		30/06/2015		43%		08/04/2015		30/06/2015		350,000.00		149,018.39		OBRA		1	
6210	ELECTRIFICACION DE CALLES VISTA HERMOSA		FISM 2014		VISTA HERMOSA		100%		08/04/2015		30/06/2015		69%		08/04/2015		30/06/2015		1,656,338.28		1,144,467.10		OBRA		1	
6218	ELECTRIFICACION DE CALLES ESPRITU SANTO		FISM 2014		ESPRITU SANTO		100%		17/03/2015		25/05/2015		82%		17/03/2015		25/05/2015		300,000.00		247,206.58		OBRA		1	
FISM 2014																				2,656,338.28		1,708,113.84				



L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS



ARO. BUECO NETA WAJUE ANSEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



CORREGIDORA
CIUDADANA

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 29 de febrero 2016

PERIODO:	FEBRERO												
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO												
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	AVANCE FÍSICO FINANCIERO				INVERSIÓN		METAS		
					FÍSICO	FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
615261	PAVIMENTACION VARIAS CALLES	DERROLLO REGIONAL 2014	LOS OLIVERA	100%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
	DESARROLLO REGIONAL 2014				07/01/2014	31/03/2015	79%	07/01/2014	31/03/2015	3,499,999.87	2,769,098.43	M2	8089.6
										3,499,999.87	2,769,098.43		

LA GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ABQ. BUCIO BETA MINDEL ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.



PERIODO:	FEBRERO													
ENTIDAD:	QUERETARO	AVANCE FISICO FINANCIERO												
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERETARO	FISICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS				
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Termino	%	Fecha Inicio	Termino	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
62301	ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	EMPRESTITO 2014	CANDILES	40%	22/06/2015	15/08/2015	17%	22/06/2015	15/08/2015	25,000,000.00	4,367,387.32	ALBERCA	1	
62302	PUENTE EN RIBERA DEL RIO	EMPRESTITO 2014	EL PUEBLITO	40%	22/06/2015	15/08/2015	22%	22/06/2015	15/08/2015	10,000,000.00	2,190,380.22	PUENTE	1	
62304	AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES ENTRONQUE A HUMILPAN	EMPRESTITO 2014	SANTA BARBARA	92%	06/07/2015	15/08/2015	91%	06/07/2015	15/08/2015	10,000,000.00	9,120,716.81	AMPLIACION	1	
6113 E	EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	EMPRESTITO 2014	EL PUEBLITO	72%	03/07/2014	30/07/2015	44%	03/07/2014	30/07/2015	20,000,000.00	8,882,098.87	EDICIO	1	
EMPRESTITO										65,000,000.00		24,560,583.22		

LA GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARO. BUCIO NETA ANGEL ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:	FEBRERO	AVANCE FISICO FINANCIERO				INVERSION							
ENTIDAD:	QUERETARO	FISICO		FINANCIERO		INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA	METAS					
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERETARO												
No. De Otra	Descripcion	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Termino	%	Fecha Inicio	Fecha Termino	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60204	CONSTRUCCION DE ARCOTECHEO ESCUELA RAFAEL RAMIREZ	FISM 2015	EL JARAL	100%	09/11/2015	04/01/2016	100%			500,000.00	497,999.54	ARCOTECHEO	1
60205	ELECTRIFICACION DE CALLES ACCESO PRINC CALLE JAMAICA	FISM 2015	CORREGIDORA	90%	04/11/2015	22/12/2015	86%			600,000.00	405,470.00	ML	315
60206	ELECTRIFICACION E ILUMINACION DE CALLE CAMINO AL JARAL	FISM 2015	EL JARAL	90%	25/11/2015	19/01/2015	35%			1,200,000.00	414,415.15	ML	315
60207	ELECTRIFICACION DE CALLESACCES PRINCIPAL A SANTA MARIA	FISM 2015	ISANTA BARABARA	100%	03/11/2015	28/12/2015	88%			400,000.00	351,154.83	ML	200
60208	ELECTRIFICACION DE CALLES DE 15 DE MAYO Y 5 DE MAYO	FISM 2015	CORREGIDORA	100%	03/11/2015	23/11/2015	75%			500,000.00	375,604.02	ML	220
60209	ELECTRIFICACION DE CALLES ANDADOR ACCESO IGLESIA	FISM 2015	CORREGIDORA	100%	04/11/2015	22/12/2015	67%			250,000.00	167,805.83	ML	110
60210	ELECTRIFICACION DE CALLES CIRCUITO 11 FEBRERO	FISM 2015	CORREGIDORA	90%	04/11/2015	29/12/2015	86%			350,000.00	300,049.65	ML	180
60211	ELECTRIFICACION DE CALLES VALLES DEL SOL	FISM 2015	LA NEGRETA	100%	04/11/2015	22/12/2015	77%			121,732.00	94,304.18	ML	80
60213	URBANIZACION DE CALLES PITA	FISM 2015	PITA	100%	09/11/2015	15/01/2016	98%			358,540.00	349,893.12	M2	500
60216	ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO DE ZONA DEPORTIVA 21 DE MARZO	FISM 2015	CORREGIDORA	100%	09/11/2015	28/12/2015	74%			350,000.00	258,736.49	M2	110
60217	ELECTRIFICACION DE CALLES (GRAL BERNARDO REYES)	FISM 2015	CORREGIDORA	100%	04/11/2015	26/01/2016	69%			400,000.00	275,859.08	ML	200
FISM 2015										5,030,272.00	3,491,281.89		

LA GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARO. BUENO ESTANISLAO ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:	FEBRERO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
----------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

LA GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARO. BUICETA MQUE/ ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PERIODO: FEBRERO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD: QUERÉTARO															
MUNICIPIO: CORREGIDORA QUERÉTARO															
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		Unidad de Medida		Aprobadas	
				%	Fecha Inicio Termino	%	Fecha Inicio Termino	Total	Total	Total	Total				
61606	2DA ETAPA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPORTIVA DE CANDILES	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	CORREGIDORA	100%	08/06/2015 08/08/2015	75%	08/06/2015 08/08/2015	9,542,820.55	7,153,682.03	IND DEPORTIVA				1	
61607	UNIDAD DEPORTIVA CANDILES, PISTA DE PATINAR, TARTAN, CANCHA DE FRONTENIS Y TENIS COL. LOS CANDILES	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	CORREGIDORA	100%	08/06/2015 08/08/2015	72%	08/06/2015 08/08/2015	1,498,420.78	1,075,013.18	CANCHA				1	
61609	PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL, 20 DE ENERO	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	CORREGIDORA	100%	13/07/2015 24/08/2015	100%	13/07/2015 24/08/2015	2,742,953.52	2,742,953.52	PARQUE				1	
61610	PARQUE LINEAL AMSTERDAM, CHABACANO	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	CORREGIDORA	100%	10/08/2015 05/10/2015	100%	10/08/2015 05/10/2015	3,377,198.00	3,377,198.00	PARQUE				1	
61611	MEJORAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO CICLOPISTA, ILUMINACIÓN Y GYM EN PASEO CONSTITUYENTES, EN COLONIAS PUEBLO NUEVO, CRUZ DE FUEGO, RINCONADA SAN JOAQUIN, HUERTAS DEL CARMEN	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	CORREGIDORA	95%	27/11/2015 30/12/2015	80%		2,156,404.10	1,720,946.40					1	
61612	REHABILITACIÓN DE PARQUE CANDILES	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	CORREGIDORA	100%		0%		696,443.82		PARQUE				1	
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015								20,014,240.77	16,009,793.13						

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. BUENO RETA M. GUILLERMO
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PERIODO:	FEBRERO													
ENTIDAD:	QUERETARO		AVANCE FISICO FINANCIERO											
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERETARO		FISICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA		METAS			
No. De Obra	Descripcion		Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Terminó	%	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
61705	CENTRO DE DESARROLLO HUMANO LOS OLIVERA		FONDO DE CULTURA 2015	CORREGIDORA	100%	07/08/2015	15/10/2015	100%	07/08/2015	15/10/2015	1,096,907.08	1,096,907.08	EDIFICIO	1
61704	REMEDIACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA CANDILES		FONDO DE CULTURA 2015	CORREGIDORA	92%	10/06/2015	10/09/2015	100%	10/06/2015	10/09/2015	1,919,551.18	1,919,551.18	EDIFICIO	1
FONDO DE CULTURA 2015														
3,016,458.26														
3,016,458.26														



PERIODO:	FEBRERO																			
ENTIDAD:	QUERETARO				AVANCE FISICO FINANCIERO		INVERSION													
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERETARO				FISCO		FINANCIERO		INVERSION EJERCIDA ACUMULADA											
No. De Otra	Descripcion				FONDO		Localidad		METAS											
16026	6.- COLONIA FILOSOFAL (JUEGOS INFANTILES, CANCHA USOS MÚLTIPLES, ALUMBRADO).				GD 2013	FILOSOFAL	%	Fecha Inicio	Fecha Termin	%	Fecha Inicio	Fecha Termin	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas				
16215	15.- HABILITACION DE BAÑOS CABILDO Y OFICINA REGIDORES.				GD 2013	EL PUEBLITO	100%	25/03/2014	20/05/2014	77%	25/03/2014	20/05/2014	1,276,093.75	980,559.85	MODULO	1				
60139	AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD INFANTIL				GD 2013	CORREGIDORA	100%	15/04/2015	21/07/2015	58%	15/04/2015	21/07/2015	1,500,000.00	863,997.55	MODULO	1				
6104	GD 2014 COMPLEMENTO AULA DIDACTICA SEC. JUAN ALDAMA				GD 2013	LOS ALDAMA	100%	03/08/2015	31/08/2015	83%	03/08/2015	31/08/2015	583,276.17	484,445.19	MODULO	1				
6107	COMPLEMENTO DE REHABILITACION UNIVERSIDAD INFANTIL				GD 2013	LOS ALDAMA	100%	24/10/2014	07/12/2014	100%	24/10/2014	07/12/2014	138,000.00	137,403.59	AULA	1				
6109	BARDA PERIMETRAL PARQUE AVAMENERA BALVANERA				GD 2013	EL PUEBLITO	100%	26/02/2015	22/04/2015	100%	26/02/2015	22/04/2015	202,233.38	202,233.38	MODULO	1				
DIRECTO 2013											60%	06/03/2015	26/06/2015	78%	06/03/2015	26/06/2015	959,959.62	749,904.21	ML	
											4,659,592.92		3,417,543.77							

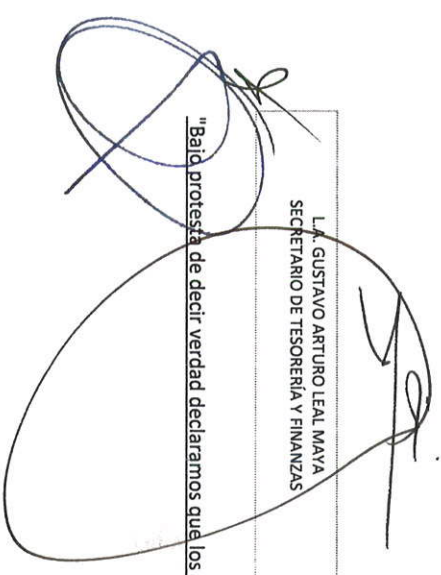



CONGRESO
ESTADAL
DE QUERÉTARO

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 29 de febrero 2016

PERIODO:	FEBRERO					INVERSIÓN							
ENTIDAD:	QUERETARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO				INVERSIÓN							
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERETARO	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS					
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
619988	CENTRO DE DESARROLLO HUMANO JARDINES DE LA NEGRETA	PRONAPRED 2015	LA NEGRETA	30%	31/07/2015	09/10/2015	0%	31/07/2015	09/10/2015	3,000,000.00		M2	
619989	INSTALACION DE LUMINARIAS SENDEROS SEGUROS	PRONAPRED 2015	CORREGIDORA	60%	10/07/2015	03/09/2015	63%	10/07/2015	03/09/2015	1,200,000.00	759,155.97	LUMINARIAS	
619990	MEJORAMIENTO DE CALLES Y AMPLIACION BANQUETAS	PRONAPRED 2015	CORREGIDORA	100%	10/07/2015	20/08/2015	80%	10/07/2015	20/08/2015	800,000.00	638,888.89	OBRA	1
619991	REHABILITACION DE ESPACIO RECREATIVO	PRONAPRED 2015	CORREGIDORA	100%	10/07/2015	20/08/2015	80%	10/07/2015	20/08/2015	1,499,999.94	1,202,466.59	OBRA	1
PRONAPRED 2015										6,499,999.94	2,600,511.85		


L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS


ARG. BUCIO RETA MIGUEL ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:	FEBRERO												
ENTIDAD:	QUERETARO	AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERETARO	FISICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS			
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha		%	Fecha		Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
					Inicio	Término		Inicio	Término				
623986	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, PARQUE LINEAL PROL. ZARAGOZA AV. CANDILES	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015	LA NEGRETA	100%	10/08/2015	21/09/2015	73%			3,756,000.04			
CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015													
										3,756,000.04	2,744,075.32		

LA GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARO. BUCIO RET. MIGUEL ANGE
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 29 de febrero 2016

PERIODO:	FEBRERO														
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Otra	Description		Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida		Aprobadas
627001	PDRTS 2015 PROY EIEC P.I. REGEN IMAGEN URBANA		CONVENIO DE TURISMO 2015	CORREGIDORA	0%	18/12/2015	30/12/2015	0%	18/12/2015	30/12/2015	1,594,792.70	-			
CONVENIO DE TURISMO 2015											1,594,792.70	-			

LA GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. BUQUESTA MIGUEL ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

FECHA: 29 de febrero 2016

PERIODO:	FEBRERO	AVANCE FISICO FINANCIERO										INVERSION							
ENTIDAD:	QUERETARO																		
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERETARO	FISICO										FINANCIERO		INVERSION APROBADA		INVERSION EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripcion	Fondo	Localidad	%	Fecha inicio	Fecha Término	%	Fecha inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas						
606006	ALUMBRADO PUBLICO CALLE I, ZARAGOZA 16 SEP.	HABITAT 2015	CORREGIDORA	100%	25/11/2015	30/12/2015	100%	25/11/2015	30/12/2015	219,726.00	218,910.68								
606007	ALUMBRADO DE LA CALLE NOCHE BUENA	HABITAT 2015	CORREGIDORA	0%	25/11/2015	30/12/2015	93%	25/11/2015		110,181.00	102,579.07								
606008	EQUIPAMIENTO CENTRO DE DESARROLLO HUMANO	HABITAT 2015	CORREGIDORA	0%	25/11/2015	30/12/2015	90%	25/11/2015		400,000.00	359,895.73								
606012	URBANIZACION CALLE JARDINES ORO LA NEGRETA	HABITAT 2015	LA NEGRETA	100%	22/12/2015	31/12/2015	88%	22/12/2015		273,167.00	239,690.68								
606013	URBANIZACION CALLE JARDINES DEL PEDREGAL	HABITAT 2015		100%	19/12/2015	31/12/2015	100%	19/12/2015		2,130,176.00	2,129,393.47								
606014	URBANIZACION CALLE JARDINES DE CORREGIDORA	HABITAT 2015		100%	00/01/1900	00/01/1900	99%	00/01/1900		290,625.00	288,522.89								
606015	URBANIZACION CALLE 5 DE MAYO, LA NEGRETA	HABITAT 2015	LA NEGRETA	100%	00/01/1900	00/01/1900	100%	00/01/1900		780,523.00	779,766.17								
606016	URBANIZACION CALLE 9 DE FEBRERO LA NEGRETA	HABITAT 2015	LA NEGRETA	100%	00/01/1900	00/01/1900	99%	00/01/1900		916,888.00	911,264.00								
606017	CONSTRUCCION 1RA ETAPA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MISION SAN JUAN	HABITAT 2015	LA NEGRETA	0%	04/01/2016	28/03/2016	0%	04/01/2016		2,447,679.00	-								
HABITAT 2015										7,588,965.00	5,030,022.89								

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARO. BUCCIO REY MIQUEL ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:		FEERERO																									
ENTIDAD:		QUERETARO																									
MUNICIPIO:		CORREGIDORA QUERETARO		FISCO		FINANCIERO		INVERSION APROBADA		INVERSION EJERCIDA ACUMULADA		METAS															
No. De Otra		Descripcion		Fondo		Localidad		%		Fecha Inicio		Fecha Termino		%		Fecha Inicio		Fecha Termino		Total		Total		Unidad de Medida		Aprobadas	
606006		ALUMBRADO PUBLICO CALLE I. ZARAGOZA 16 SEP.		HABITAT 2015		CORREGIDORA		100%		25/11/2015		30/12/2015		100%		25/11/2015		30/12/2015		146,484.00		145,940.46					
606007		ALUMBRADO DE LA CALLE NOCHE BUENA		HABITAT 2015		CORREGIDORA		0%		25/11/2015		30/12/2015		93%		25/11/2015				73,454.00		68,386.05					
606008		EQUIPAMIENTO CENTRO DE DESARROLLO HUMANO		HABITAT 2015		CORREGIDORA		0%		25/11/2015		30/12/2015		90%		25/11/2015				317,836.00		285,564.67					
606017		CONSTRUCCION 1RA ETAPA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MISION SAN JUAN		HABITAT 2015		LA NEGRETA		0%		04/01/2016		28/03/2016		0%		04/01/2016				1,631,790.00		-					
HABITAT 2015 (MUNICIPAL)																				2,169,564.00		499,891.18					



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 29 de febrero 2016

PERIODO:	FEBRERO														
ENTIDAD:	QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN						
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS				
No. De Obra	Descripción		Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
607001	PARQUE CRUZ DE FUEGO, CRUZ DE FUEGO		PREP 2015	CRUZ DE FUEG	100%	25/11/2015	30/12/2015	97%	25/11/2015	30/12/2015	1,000,000.00	967,267.05			
607002	PREP 2015 PARQUE VIVO QUERÉTARO (EL BATÁN)		PREP 2015	EL BATÁN	100%	19/12/2015	31/12/2015	100%	19/12/2015	31/12/2015	1,700,000.00	1,694,727.82			
PREP 2015												2,700,000.00	2,661,994.87		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ABO. BUJO BETAN MIGUEL ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

FECHA: 29 de febrero 2016

PERIODO:	FEVERERO	AVANCE FISICO FINANCIERO										INVERSION		METAS	
ENTIDAD:	QUERETARO											INVERSION EJERCIDA ACUMULADA			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERETARO														
No. De Obra	Descripción	FONDO	Localidad	%	Físico Fecha Inicio	Termino	%	Financiero Fecha Inicio	Termino	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
60101	URBANIZACION DE CALLES CARCO BLANCO	GD 2015	CHARCO BLANCO	100%	06/07/2015	17/08/2015	100%	06/07/2015	17/08/2015	595,252.76	595,252.76	M2	800		
60102	EMPERADO DE CALLE ARBOLEDAS Y NOGALES	GD 2015	PRESA DE BRAVO	80%	06/07/2015	10/08/2015	100%	06/07/2015	10/08/2015	495,252.45	495,252.45	M2	600		
60103	EMPERADO DE AV. DE LA LUZ Y SAN RAFAEL	GD 2015	SAN RAFAEL	100%	06/07/2015	16/08/2015	100%	06/07/2015	16/08/2015	440,716.11	440,716.11	M2	550		
60104	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	GD 2015	PURISIMA DE SAN RAFAEL	100%	17/08/2015	28/09/2015	66%	17/08/2015	28/09/2015	346,532.50	228,224.49	CLINICA	1		
60109	URBANIZACION DE CALLES RIO NILO Y RIO DE JANEIRO	GD 2015	ARROYO HONDO	100%	28/05/2015	22/07/2015	100%	28/05/2015	22/07/2015	451,710.19	451,710.19	M2	670		
60112	BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES: MARGARITAS, LAURELES, TULIPANES, AZUCENAS, JAZMIN Y CAMELINAS	GD 2015	EL POMERAL	100%	28/05/2015	08/07/2015	100%	28/05/2015	08/07/2015	380,388.63	380,388.63	M2	490		
60113	PUNTE ALCATRILLA CALICHAR	GD 2015	EL CALICHAR	0%			0%					PUNTE	1		
60118	ELECTRIFICACION DE CALLES COLINAS DEL SUR	GD 2015	PARQUE COLINAS DEL SUR	80%	18/08/2015	12/10/2015	63%	18/08/2015	12/10/2015	396,392.90	251,557.53	M/L	210		
60119	PARQUE (ILUMINACION, AREA VERDE Y ESCALERAS)	GD 2015	VALLE DORADO 2000	80%	28/08/2015	19/11/2015	0%	28/08/2015	19/11/2015	644,000.99	-	M/L	210		
60120	ADOME DE DREN COLINAS DEL BOSQUE	GD 2015	COLINAS DEL BOSQUE	100%	18/06/2015	16/07/2015	67%	18/06/2015	16/07/2015	99,135.70	66,243.32	PARQUE	400		
60122	CENTRO DE DESARROLLO HUMANO CHARCO BLANCO	GD 2015	CHARCO BLANCO	59%	18/09/2015	24/12/2015	26%	18/09/2015	24/12/2015	4,499,222.83	1,162,738.86	M/L	400		
60124	PAYMENTACION EN CALLE LOS ANGELES	GD 2015	LOS ANGELES	100%	05/06/2015	27/08/2015	100%	05/06/2015	27/08/2015	1,485,343.31	1,485,343.31	M2	6300		
60126	PAYMENTACION DE CALLES (S DE MAYO) EMILIANO ZAPATA	GD 2015	EMILIANO ZAPATA	100%	23/07/2015	19/08/2015	55%	23/07/2015	19/08/2015	654,239.18	359,542.13	M2	1850		
60127	BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	GD 2015	EMILIANO ZAPATA	100%	01/09/2015	29/09/2015	99%	01/09/2015	29/09/2015	250,000.00	248,222.12	M2	900		
60130	ESTUDIOS PERMISOS Y TRAMITES	GD 2015	CORREGIDORA	N/A			2%			1,958,360.40	41,800.00	M/L	80		
60132	CAFETERIA ESC. SEC. JUAN ALDAMA	GD 2015	LOS ANGELES	100%	06/07/2015	11/09/2015	50%	06/07/2015	11/09/2015	832,975.22	412,975.22	EDIFICIO	1		
60134	BANOS TEATRO POPULAR EL PUEBLITO	GD 2015	EL PUEBLITO	0%	23/07/2015	12/08/2015	0%	23/07/2015	12/08/2015	1,350,000.00	-	MODULO	1		
60136	TERMINACION PARQUE EL PUEBLITO	GD 2015	EL PUEBLITO	100%	23/07/2015	12/08/2015	100%	23/07/2015	12/08/2015	200,844.93	200,844.93	PARQUE	1		
60137	ALUMBRADO SAN JOSE DE LOS OLIVERADO UNIDAD DEPORTIVA	GD 2015	SAN JOSE DE LOS OLIVERA	0%			0%			220,000.00	-	LUMINARIAS	20		
60138	CERCADO PERIMETRAL ANTIGUO PANTEON.	GD 2015	EL PUEBLITO	100%	02/09/2015	29/09/2015	100%	02/09/2015	29/09/2015	99,176.74	99,176.74	M/L	90		
60143	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AUDITORIO USOS MULTIPLES	GD 2015	EL PUEBLITO	100%	07/09/2015	26/09/2015	90%	07/09/2015	26/09/2015	694,845.89	627,779.35	OBRA	1		
60144	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CENTRO CULTURA 1A ETAPA BALVANERA	GD 2015	BALVANERA	90%			90%			580,000.00	520,537.12	OBRA	1		
60155	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CDH LOS OLIVERA	GD 2015	CORREGIDORA	0%	01/02/2016	09/05/2016	0%	01/03/2016	09/05/2016	1,000,000.00	-	-	-		
60156	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CDH LOMAS DE BALVANERA	GD 2015	CORREGIDORA	0%	01/02/2016	14/02/2016	0%	01/02/2016	14/02/2016	880,000.00	-	-	-		
60157	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CANCHAS DE ARRIBA STA BARBARA	GD 2015	CORREGIDORA	50%	01/02/2016	05/02/2016	0%	01/02/2016	05/02/2016	119,138.84	-	-	-		
60159	TERRACERIAS PARQUE VILLA DORADA	GD 2015	CORREGIDORA	50%	01/02/2016	05/02/2016	0%	01/02/2016	05/02/2016	53,284.00	-	-	-		
60160	SUMINISTROS DE MATERIALES RELLENO PARQUE RIBERA	GD 2015	CORREGIDORA	50%	01/02/2016	04/02/2016	0%	01/02/2016	04/02/2016	377,502.29	-	-	-		
60161	TERMINACION BAÑOS VESTIDORES PLAZUELA STA BARBARA	GD 2015	CORREGIDORA	50%	01/02/2016	28/02/2016	0%	01/02/2016	28/02/2016	270,000.00	-	-	-		
60162	TERMINACION BARDA PERIMETRAL CENTENARIO ZARAGOZA	GD 2015	CORREGIDORA	50%	23/12/2015	19/01/2016	0%	23/12/2015	19/01/2016	250,000.00	-	-	-		
60164	REPAVIMENTACION DE RUTA EL PEREGRINO	GD 2015	CORREGIDORA	85%	30/12/2015	08/03/2016	71%	30/12/2015	08/03/2016	5,750,000.00	4,081,693.07	-	-		
60168	PARQUE VILLA DORADA	GD 2015	CORREGIDORA	60%	13/01/2016	08/03/2016	36%	13/01/2016	08/03/2016	800,000.00	290,041.30	-	-		
60177	APERTURA Y AFECTACION DE CALLE AHUEHUETE	GD 2015	CORREGIDORA	0%			0%			400,000.00	-	-	-		
60191	ALUMBRADO PUBLICO VARIAS COLONIAS	GD 2015	CORREGIDORA	30%	13/01/2016	08/03/2016	14%	13/01/2016	08/03/2016	1,500,000.00	215,026.71	-	-		
60192	URBANIZACION DE CALLE PRIVADA HIDALGO	GD 2015	CORREGIDORA	0%	15/02/2016	13/03/2016	0%	15/02/2016	13/03/2016	190,393.43	-	-	-		
60184	BANDA COLINDANCIA PARQUE SAN CARLOS CON ZONA HAB	GD 2015	CORREGIDORA	0%	13/01/2016	08/03/2016	36%	13/01/2016	08/03/2016	1,242,938.96	448,702.41	-	-		
60188	BARDA EN CANCHA FUTBOL ILUMINACION PARQUE GARAMBUL	GD 2015	CORREGIDORA	58%	13/01/2016	08/03/2016	36%	13/01/2016	08/03/2016	1,576,469.53	-	-	-		
60194	COLOCACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL VIALIDADES	GD 2015	CORREGIDORA	50%	15/01/2016	11/02/2016	0%	15/01/2016	11/02/2016	1,887,774.00	-	-	-		
60195	PUNTE PEATONAL LIB SUR-PTM MISION MARIANA 1RA ETAPA	GD 2015	CORREGIDORA	0%	01/02/2016	14/02/2016	0%	01/02/2016	14/02/2016	500,000.00	-	-	-		
60199	COLOCACION DUCTERIA INSTAL ELECT CALLE JOSEFA ORTI	GD 2015	CORREGIDORA	50%	01/02/2016	28/02/2016	88%	01/02/2016	28/02/2016	400,000.00	353,885.63	-	-		
60187	CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA ARCO TECHO JOSE CLEMENTE	GD 2015	CORREGIDORA	100%	15/01/2016	15/01/2016	88%	15/01/2016	15/01/2016	500,000.00	353,885.63	-	-		
60183	DESCARGAS SANITARIAS PARA UNIDAD MEDICA DEL INSS	GD 2015	CORREGIDORA	50%	01/02/2016	28/02/2016	0%	01/02/2016	28/02/2016	1,000,000.00	967,267.05	-	-		
607001	PARQUE CRUZ DE FUEGO CRUZ DE FUEGO	GD 2015	CORREGIDORA	100%	25/11/2015	30/12/2015	97%	25/11/2015	30/12/2015	216,549.08	-	-	-		
60186	REHABILIT BANDA PERIMETRAL Y REJA EN CANCHA	GD 2015	CORREGIDORA	0%	01/02/2016	28/02/2016	0%	01/02/2016	28/02/2016	743,866.44	-	-	-		
60185	REHABILIT. ZONA ESTACIONAMIENTO SEG PUBLICA	GD 2015	CORREGIDORA	90%	30/12/2015	19/01/2016	9%	30/12/2015	19/01/2016	400,000.00	391,946.43	-	-		
60190	REHABILITACION DREN CIMITARIO	GD 2015	CORREGIDORA	100%	15/01/2016	28/01/2016	97%	15/01/2016	28/01/2016	100,000.00	96,694.67	-	-		
60189	REHABILITACION DREN LOS OLIVERA COLINAS BOSQUE	GD 2015	CORREGIDORA	0%	15/01/2016	28/01/2016	97%	15/01/2016	28/01/2016	495,000.00	484,355.84	-	-		
60181	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS ESC PRIM JUSTO SIERRA	GD 2015	CORREGIDORA	100%	23/12/2015	19/01/2016	98%	23/12/2015	19/01/2016	430,000.00	74,183.66	-	-		
60180	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS ESC PRIM O. PAZ EL PUEBLITO	GD 2015	CORREGIDORA	100%	23/12/2015	19/01/2016	17%	23/12/2015	19/01/2016	430,000.00	-	-	-		
60179	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS ESC SEC QUETZALCOTI	GD 2015	CORREGIDORA	100%	23/12/2015	19/01/2016	17%	23/12/2015	19/01/2016	430,000.00	-	-	-		



GOBIERNO
ESTADAL

ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

FECHA: 29 de febrero 2016

PERIODO:	FEBRERO	AVANCE FISICO FINANCIERO				INVERSION		METAS					
ENTIDAD:	QUERETARO	FISCO		FINANCIERO		INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA						
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERETARO												
No. De Obra	Descripcion	FONDO	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Termino	%	Fecha Inicio	Fecha Termino	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60182	TRABAJOS COMP EN TEATRO POPULAR EL PUEBLITO	GD 2015	CORREGIDORA	0%			0%			270,000.00			
60178	TRABAJOS COMP. IMAGEN URBANA PLAZUELA STA BARBARA	GD 2015	CORREGIDORA	100%	23/12/2015	19/01/2016	83%	23/12/2015	19/01/2016	315,000.00	262,096.05		
627001	PORTS 2015 PROV ELEC P.I. REGEN IMAGEN URBANA	GD 2015	CORREGIDORA	30%	19/12/2015	30/12/2015	0%	19/12/2015	30/12/2015	398,698.18	-		
607002	PREP 2015 PARQUE VIVO QUERETARO (EL BATAN)	GD 2015	CORREGIDORA	100%	19/12/2015	31/12/2015	100%	19/12/2015	31/12/2015	1,700,000.00	1,694,727.82	✓	
606012	URBANIZACION CALLE JARDINES ORO LA NEGRETA	GD 2015	LA NEGRETA	100%	22/12/2015	31/12/2015	88%	22/12/2015	31/12/2015	182,111.00	159,793.79	✓	
606013	URBANIZACION CALLE JARDINES DEL PEDREGAL	GD 2015	LA NEGRETA	100%	19/12/2015	31/12/2015	100%	19/12/2015	31/12/2015	1,420,117.00	1,419,595.65	✓	
606014	URBANIZACION CALLE JARDINES DE CORREGIDORA	GD 2015	LA NEGRETA	100%			99%			193,750.00	192,348.59	✓	
606015	URBANIZACION CALLE 5 DE MAYO, LA NEGRETA	GD 2015	LA NEGRETA	100%			100%			520,348.00	519,844.11	✓	
606016	URBANIZACION CALLE 9 DE FEBRERO LA NEGRETA	GD 2015	LA NEGRETA	100%			99%			611,258.00	607,509.60	✓	
DIRECTO 2015										41,041,005.48	17,428,307.50		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARCE BUQUE RUIZ MIGUEL ANGEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
