

PERIODO:	OCTUBRE												
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO												
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
62301	ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES	EMPRESTITO 2014	CANDILES	43%	22/06/2015	15/08/2015	21%	22/06/2015		\$ 25,000,000.00	\$ 5,170,878.40	ALBERCA	1
62302	PUENTE EN RIBERA DEL RIO	EMPRESTITO 2014	EL PUEBLITO	40%	22/06/2015	15/08/2015	22%	22/06/2015		\$ 10,000,000.00	\$ 2,190,380.22	PUENTE	1
62304	AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES ENTRONQUE A HUIMILPAN	EMPRESTITO 2014	SANTA BARBARA	100%	06/07/2015	15/08/2015	95%	06/07/2015		\$ 10,000,000.00	\$ 9,548,989.37	AMPLIACION	1
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	EMPRESTITO 2014	EL PUEBLITO	98%	03/07/2014	30/07/2015	73%	03/07/2014		\$ 20,000,000.00	\$ 14,652,424.24	edificio	1
62307	EMPRESTITO REPAVIMENT AV. CANDILES PROL ZARAG	EMPRESTITO 2014	CANDILES	95%	22/08/2016	16/10/2016	0%	22/08/2016		\$ 7,500,000.00	\$ -		
62308	2DA ETAPA REPAVIMENT. BLVD AMERICAS AV CANDILES A	EMPRESTITO 2014	CANDILES	95%	22/08/2016	16/10/2016	0%			\$ 3,000,000.00	\$ -		
62309	OBRAS COMPLE. EDI SEGURIDAD INST. CONTRA INCENDIO	EMPRESTITO 2014		0%			0%			\$ 1,600,000.00	\$ -		
EMPRESTITO 2014										77,100,000.00	31,562,672.23		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".




ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de Octubre de 2016

PERIODO:	OCTUBRE												
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
63301	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA,COM LA POZA	FISE 2016		62%	25/08/2016	07/12/2016	0%			\$ 3,735,000.00	296,753.50		
63302	CONSTRUCCION 1RA ETAPA RED DRENAJE COL ARBOLEDAS S	FISE 2016		88%	25/08/2016	07/12/2016				\$ 2,171,920.40	0.00		
63303	INTRO RED D DRENAJE SANITARIO COL AMPL LOS ANGELES	FISE 2016		19%	07/10/2016	17/11/2016				\$ 1,149,579.53	0.00		
FISE 2016										7,056,499.93	296,753.50		

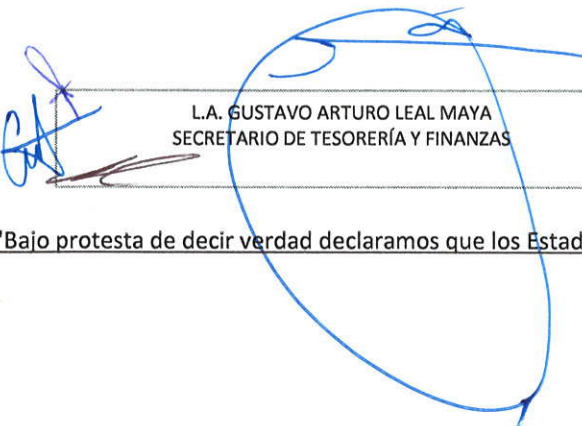

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

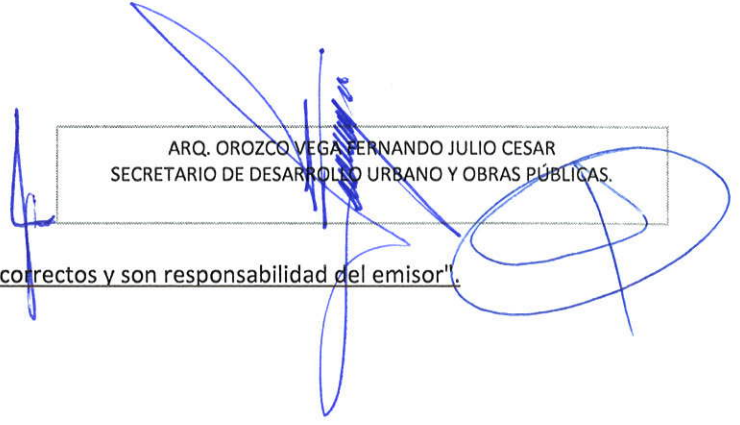

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de Octubre de 2016

PERIODO:	OCTUBRE												
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
607003	PREP 2016 V. ESP. PUBLICOS PARQUE COLONIAL	PREP 2016		0%			0%			\$ 1,032,287.74	0.00		
607004	PREP 2016 V. ESP. PUBLICOS 2016 PARQUE VILLA CANO	PREP 2016		0%			0%			\$ 1,024,793.91	0.00		
607005	PREP 2016 V ESP PUBLICOS CENTENAR DE LA CONST 1917	PREP 2016		0%			0%			\$ 1,811,501.74	0.00		
VERTIENTE PREP MUNICIPAL 2016										3,868,583.39	-		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de Octubre de 2016

PERIODO:	OCTUBRE												
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN				
				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
63101	3X1 REHABILITACION DE PLAZA CIVICA LOURDES	3x1 al Migrante (aportación Estatal, Federal y Club de Migrantes.		0%			0%			\$ 1,550,000.00	\$ 58,095.03		
PROGRAMA 3X1 AL MIGRANTE										1,550,000.00	58,095.03		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de Octubre de 2016

PERIODO:	OCTUBRE												
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
634001	CONSTR 1ER ETPA CDC CONSTIT 1917 EQUIP DE COSTURA	PROGRAMA INFRA. BASICA Y COMPLEMENTARIA		0%			0%			\$ 2,039,734.50	0.00		
634002	EQUIP CDC CENT CONSTIT 1917 SALON DE COMPUTO	PROGRAMA INFRA. BASICA Y COMPLEMENTARIA		0%			0%			\$ 358,918.00	0.00		
VERTIENTE INFRAESTRUCTURA BASICA Y COMPLEMENTARIA FEDERAL										2,398,652.50	-		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de Octubre de 2016

PERIODO:	OCTUBRE			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
606019	ME001 EMPEDRADO CLLE SNT MARIA D PUEBLITO, NEGRETA	HABITAT 2016		30%	18/10/2016	16/12/2016	0%			\$ 2,659,436.00	0.00		
606020	ME002 EMPDRDO AHOGADO EN MORTERO CLLE SAN FCO NGRT	HABITAT 2016		50%	19/10/2016	17/12/2016	0%			\$ 1,637,514.00	0.00		
VERTIENTE HABITAT MUNICIPAL 2016										4,296,950.00	-		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de Octubre de 2016

PERIODO:	OCTUBRE												
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
606019	ME001 EMPEDRADO CLLE SNT MARIA D PUEBLITO, NEGRETA	HABITAT 2016		30%	18/10/2016	16/12/2016	0%			\$ 3,382,010.00	0.00		
606020	ME002 EMPDRDO AHOGADO EN MORTERO CLLE SAN FCO NGRT	HABITAT 2016		50%	19/10/2016	17/12/2016	0%			\$ 1,849,126.00	0.00		
VERTIENTE HABITAT FEDERAL 2016										5,231,136.00	.		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de Octubre de 2016

PERIODO:	OCTUBRE												
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
607003	PREP 2016 V. ESP. PUBLICOS PARQUE COLONIAL	PREP 2016		0%			0%			\$ 1,000,000.00	0.00		
607004	PREP 2016 V. ESP. PUBLICOS 2016 PARQUE VILLA CANO	PREP 2016		0%			0%			\$ 1,000,000.00	0.00		
607005	PREP 2016 V ESP PUBLICOS CENTENAR DE LA CONST 1917	PREP 2016		0%			0%			\$ 1,500,000.00	0.00		
VERTIENTE PREP FEDERAL 2016										3,500,000.00	-		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de Octubre de 2016

PERIODO:	OCTUBRE												
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripcion	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
621001	PAVIMENTACION DE CALLE CAMINO REAL	PROGRAMAS REGIONALES 2016		0%			0%			\$ 4,137,506.36	0.00		
621002	PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES 5 DE MAYO, FCO I MAD	PROGRAMAS REGIONALES 2016		0%			0%			\$ 5,862,493.64	0.00		
PROGRAMAS REGIONALES 2016										10,000,000.00	-		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de Octubre de 2016

PERIODO:	OCTUBRE												
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO												
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN		METAS	
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	Unidad de Medida	Aprobadas
615001	URBANIZACION VIALIDADES LUIS DONALDO COLOSIO	DES REGIONAL 2016		0%			0%			\$ 2,373,600.00	0.00		
615002	MEJORAMIENTO DE VIALIDADES SAN JOSE DE LOS OLVERA	DES REGIONAL 2016		0%			0%			\$ 2,967,000.00	0.00		
615003	MEJORAMIENTO DE CALLES RIO BALSAS LA CUEVA	DES REGIONAL 2016		0%			0%			\$ 989,000.00	0.00		
615004	INTRO DRENAJE Y CONTR DE BANQUETAS AV JOSEFA ORTIZ	DES REGIONAL 2016		0%			0%			\$ 1,978,000.00	0.00		
DESARROLLO REGIONAL 2016										8,307,600.00	-		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de Octubre de 2016

PERIODO:	OCTUBRE												
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO												
No. De Obra	Descripción	FONDO	Localidad	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
630001	MEJORAMIENTO DE VIALIDAD Y URBANIZACION MISION SAN CARLOS	FORTALECE 2016	CORREGIDORA	100%	09/06/2016	03/08/2016	91%	09/06/2016	31/12/2016	\$ 3,956,000.00	\$ 3,587,704.74		
630002	AMPLIACION CARRIL DE ACCESO A COMUNIDAD ZONA SUR LOS OLVERA	FORTALECE 2016	CORREGIDORA	90%	09/06/2016	31/08/2016	38%	09/06/2016	31/12/2016	\$ 9,395,500.00	\$ 3,528,224.88		
630003	MEJORAMIENTO DE VIALIDADES Y URBANIZACION SANTA BARBARA	FORTALECE 2016	CORREGIDORA	100%	09/06/2016	03/08/2016	100%	09/06/2016	31/12/2016	\$ 5,934,000.00	\$ 5,922,136.24		
630004	MEJORAMIENTO DE CALLES CANDILES	FORTALECE 2016	CORREGIDORA	100%	30/06/2016	10/08/2016	23%	30/06/2016	31/12/2016	\$ 2,967,000.00	\$ 669,112.25		
630005	MEJORAMIENTO DE ACCESO A LOS OLVERA	FORTALECE 2016	CORREGIDORA	80%	04/07/2016	25/09/2016	0%	04/07/2016	31/12/2016	\$ 3,461,500.00	\$ -		
630006	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL MISION MARIANA	FORTALECE 2016	CORREGIDORA	98%	09/06/2016	31/08/2016	88%	09/06/2016	31/12/2016	\$ 4,945,000.00	\$ 4,334,687.56		
FORTALECE 2016										30,659,000.00	18,041,865.67		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de Octubre de 2016

PERIODO:	OCTUBRE												
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO												
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60224	URBANIZACION DE CALLES EN VILLA DORADA	FISM 2016	Villa Dorada	27%	25/09/2016	03/12/2016	0%			983,053.20	-		
60225	DRENAJE PRADERAS DE GUADALUPE	FISM 2016	Praderas de Guadalupe	45%	25/09/2016	15/01/2017	0%			4,587,581.60	-		
60226	AMP DE RED DE DRENAJE SANITAR COL. AMP LOS ANGELES	FISM 2016	Los Angeles	100%	25/09/2016	27/12/2016	0%			983,053.20			
60227	URBANIZACION EN VILLA DORADA	FISM 2016	Villa Dorada	0%			0%			1,137,000.00			
60222	INDIRECTOS	FISM 2016	CORREGIDORA	0%			0%			60,000.00			
FISM 2016										7,750,688.00	-		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de Octubre de 2016

PERIODO:	OCTUBRE												
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
619494	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN SANTA BARBARA (RECUPERACION DE ESPACIOS PÚBLICOS)	PRONAPRED 2016		43%	07/09/2016	29/11/2016	0%			\$ 2,500,000.00	0.00		
PRONAPRED										2,500,000.00	0.00		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de Octubre de 2016

PERIODO:	OCTUBRE					AVANCE FÍSICO FINANCIERO			INVERSIÓN					
ENTIDAD:	QUERÉTARO													
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO					FÍSICO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	FONDO	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas				
60119	PARQUE (ILUMINACIÓN, ÁREA VERDE Y ESCALERAS)	GD 2015	VALLE DORADO 2000	100%	28/08/2015	19/11/2015	\$ 548,596.77	\$ 548,596.77	ML	210				
60122	CENTRO DE DESARROLLO HUMANO CHARCO BLANCO	GD 2015	CHARCO BLANCO	100%	18/09/2015	24/12/2015	\$ 2,263,252.00	\$ 2,263,252.00	ML	400				
60134	BAÑOS TEATRO POPULAR EL PUEBLITO	GD 2015	EL PUEBLITO	0%	14/12/2015	12/03/2016	\$ 1,350,000.00	\$ -	MODULO	1				
60156	TRABAJO COMPLEMENTARIO CDH LOMAS DE BALVANERA	GD 2015	CORREGIDORA	100%	01/03/2016	11/04/2016	\$ 828,801.71	\$ 828,801.71						
60177	APERTURA Y AFECTACION DE CALLE AHUEHUETE	GD 2015	CORREGIDORA	0%	-	-	\$ 400,000.00	\$ -						
60191	ALUMBRADO PUBLICO VARIAS COLONIAS	GD 2015	CORREGIDORA	100%	13/01/2016	08/03/2016	\$ 1,103,763.71	\$ 1,103,763.71						
60194	COLOCACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL VIALIDADES	GD 2015	CORREGIDORA	100%	15/01/2016	11/02/2016	\$ 1,576,469.53	\$ 768,828.08						
60195	PUNTE PEATONAL LIB SUR-PT MISION MARIANA 1RA ETAPA	GD 2015	CORREGIDORA	100%	06/05/2016	28/07/2016	\$ 1,830,584.57	\$ 1,830,584.57						
60196	TRABAJO COMPLETO. OBRAS MENORES VIA PUBLICA	GD 2015	CORREGIDORA	100%	27/05/2016	21/07/2016	\$ 297,714.25	\$ 297,714.25						
60197	COLINDANCIA BARRA JARDINES DE LA ESPERANZA	GD 2015	CORREGIDORA	100%	06/05/2016	28/07/2016	\$ 293,530.00	\$ 293,530.00						
607001	PARQUE CRUZ DE FUEGO, CRUZ DE FUEGO	GD 2015	CORREGIDORA	100%	25/11/2015	30/12/2015	\$ 967,267.05	\$ 967,267.05						
60186	REHABILIT BARRA PERIMETRAL Y REJA EN CANCHA	GD 2015	CORREGIDORA	100%	06/05/2016	02/06/2016	\$ 208,941.85	\$ 208,941.85						
60189	REHABILITACION DREN LOS OLIVERA COLINAS BOSQUE	GD 2015	CORREGIDORA	96%	11/04/2016	05/06/2016	\$ 211,135.92	\$ 211,135.92						
619988	CENTRO DE DESARROLLO HUMANO JARDINES DE LA NEGRETA	GD 2015	LA NEGRETA	62%	31/07/2015	09/10/2015	\$ 2,830,009.00	\$ 1,638,528.13						
619989	INSTALACION DE LUMINARIAS SENDEROS SEGUROS	GD 2015	CORREGIDORA	75%	10/07/2015	03/09/2015	\$ 383,701.16	\$ -						
607002	PREP 2015 PARQUE VIVO QUERETARO (EL BATAN)	GD 2015	CORREGIDORA	100%	19/12/2015	31/12/2015	\$ 1,694,727.82	\$ 1,694,727.82						
606012 GD	URBANIZACION CALLE JARDINES QRO LA NEGRETA	GD 2015	LA NEGRETA	100%	22/12/2015	31/12/2015	\$ 159,793.79	\$ 159,793.79	\$	399,484.47				
606013 GD	URBANIZACION CALLE JARDINES DEL PEDREGAL	GD 2015	JARDINES DEL PEDREGAL	100%	19/12/2015	30/12/2015	\$ 1,419,074.30	\$ 1,418,552.95	\$	3,548,989.12	\$	2,129,393.47		
606014 GD	URBANIZACION CALLE JARDINES DE CORREGIDORA	GD 2015	CORREGIDORA	100%	22/12/2015	31/12/2015	\$ 192,348.59	\$ 192,348.59	\$	480,861.48	\$	288,516.89		
606015 GD	URBANIZACION CALLE 5 DE MAYO, LA NEGRETA	GD 2015	LA NEGRETA	100%	19/12/2015	30/12/2015	\$ 519,844.51	\$ 519,844.51	\$	1,299,610.28				
606016 GD	URBANIZACION CALLE 9 DE FEBRERO LA NEGRETA	GD 2015	LA NEGRETA	100%	19/12/2015	30/12/2015	\$ 607,510.00	\$ 607,510.00	\$	1,518,774.00				
601117	OBRAS DE CONTINGENCIAS Y MANTENIMIENTO PLUVIAL	GD 2015	CORREGIDORA	100%	21/06/2016	29/08/2016	\$ 3,500,000.00	\$ 3,498,346.81						
601113	MEJORAMIENTO DE VIALIDAD EN MARGEN DREN TEJEDA	GD 2015	TEJEDA	100%	08/06/2016	16/08/2016	\$ 747,562.28	\$ 747,562.28						
601114	CONSTRUCCION OFI Y ALMACEN AREA EVENTOS PRESI MUNIC	GD 2015	CORREGIDORA	0%	-	-	\$ 600,000.00	\$ -						
601115	URBANIZACION VIAL EN LATERAL CARR ESTA 411	GD 2015	CORREGIDORA	100%	12/06/2016	07/06/2016	\$ 4,497,156.54	\$ 3,783,148.66						
601116	PAVIMENTACIÓN BOULEVARD DE LAS AMÉRICAS	GD 2015	LAS AMERICAS	100%	08/06/2016	30/08/2016	\$ 748,169.91	\$ 579,434.12						
60156	TRABAJO COMPLETO CDH LOMAS BALVANERA	GD 2015	LOMAS DE BALVANERA	100%	01/03/2016	11/04/2016	\$ 828,801.71	\$ 828,801.71						
6104	GD 2014 COMPLEMENTO AULA DIDACTICA SEC JUAN ALDAMA	GD 2015		100%	-	-	\$ 136,796.07	\$ 136,796.07						
60132	APORTACION DE COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA	GD 2015		0%	-	-	\$ 420,000.00	\$ -						
601128	MAC BANQUETAS Y GUARNICIONES, LA NEGRETA 2DA ETAPA	GD 2015	LA NEGRETA	0%	-	-	\$ 338,700.00	\$ -						
601131	TRABAJO DE VIALIDAD CAMINO A LAS FLORES	GD 2015		0%	-	-	\$ 650,000.00	\$ -						
601132	TORRENTERA PLUVIAL EN AVENIDA CUMBRES, DEL ROBLE	GD 2015		0%	-	-	\$ 718,000.00	\$ -						
601133	NICHO PARA IMAGEN EN PARQUE RIBERA DEL RIO	GD 2015		0%	-	-	\$ 323,327.18	\$ -						
601136	URBANIZACION DE CALLES VALLE DE SANTIAGO	GD 2015		0%	-	-	\$ 1,053,994.21	\$ -						
601135	BARRA COLINDNT ZONA D BOMBAS AGUA CEA PARQUE LINEAL	GD 2015		0%	-	-	\$ 42,889.64	\$ -						
601123	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL VIALIDADES	GD 2015		0%	-	-	\$ 11,476.32	\$ -						
Gasto Directo 2015							\$ 34,303,940.39	\$ 25,127,811.35						

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARO. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

"Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de Octubre de 2016

PERIODO:	OCTUBRE													
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
16215	15.- HABILITACIÓN DE BAÑOS CABILDO Y OFICINA REGIDORES.	GD 2013	EL PUEBLITO	100%	15/04/2015	21/07/2015	100%	15/04/2015	30/09/2016	\$ 1,210,849.38	\$ 1,210,849.38	MODULO	1	
6109	BARDA PERIMETRAL PARQUE AMANECER BALVANERA	GD 2013	LOMAS DE BALVANERA	100%	06/03/2015	25/06/2015	100%	06/03/2015	30/09/2016	\$ 831,630.39	\$ 831,630.39	ML		
6118	CENTRO CUTURAL TEJEDA 2DA ETAPA	GD 2013	TEJEDA	100%	13/03/2015	07/05/2015	100%	13/03/2015	30/09/2016	\$ 88,569.36	\$ 88,569.36			
60184	BARDA COLINDANCIA PARQUE SAN CARLOS CON ZONA HAB	GD 2013	CORREGIDORA	100%	06/05/2016	02/06/2016	100%	06/05/2016	30/09/2016	\$ 20,794.30	\$ 20,794.30			
Gasto Directo 2013										2,151,843.43	2,151,843.43			

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PERIODO:	OCTUBRE													
ENTIDAD:	QUERÉTARO				AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripcion	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
6102	VIVIENDA GASTO DIRECTO	GD 2014	SAN JOSE DE LOS OLVERA	79%	30/05/2016	27/09/2016	97%	30/05/2016		\$ 1,000,000.00	\$ 783,578.46			
6113	EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD 2014	EL PUEBLITO	100%	03/07/2014	30/07/2015	73%	03/07/2014		\$ 41,190,000.00	\$ 30,176,667.81	EDIFICIO	1	
60184	BARDA COLINDANCIA PARQUE SAN CARLOS CON ZONA HAB	GD 2014	CORREGIDORA	100%	06/05/2016	02/06/2016	100%	06/05/2016		\$ 347,369.31	\$ 347,369.31			
601137	DUCTERIA INSTALACIONES FIBRA OPTICA C PEDRO URTIAG	GD 2014								\$ 102,149.11	\$			
Gasto Directo 2014										42,639,518.42	31,307,615.58			

I.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de Octubre de 2016

PERIODO:	OCTUBRE												
ENTIDAD:	QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Fondo	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
60223	MEJORAMIENTO DE CALLES VILLA DORADA (FISM 2009-20010-2011-2013-2014-2015)	FISM 2015	CORREGIDORA	100%	27/05/2016	21/07/2016	60%	27/05/2016	21/07/2016	\$ 90,873.08	\$ 69,928.59		
	FISM 2015									90,873.08	69,928.59		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 de Octubre de 2016

PERIODO:	OCTUBRE												
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	CORREGIDORA QUERÉTARO												
No. De Obra	Descripción	FONDO	Localidad	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
				FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
				%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
601100	INTERVENCIÓN RV URB INTEGRAL EN VIALIDADES, PURISIM SAN RAFAEL	GD 2016	SAN RAFAEL	99%	16/05/2016	07/08/2016	89%	16/05/2016		\$ 1,949,782.93	\$ 1,727,489.72		
601101	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD (VARIAS)	GD 2016	CORREGIDORA	19%	04/07/2016	31/10/2016	0%			\$ 2,498,105.15	\$ -		
601102	REHABILITAC D OFICINAS DE ATNC A USUARIOS CATASTRO	GD 2016	CORREGIDORA	99%	25/05/2016	21/09/2016	98%	25/05/2016		\$ 2,471,130.72	\$ 2,413,916.38		
601105	ACCESOS A SECUNDARIA TECNICA JUAN ALDAMA LOS ANGEL	GD 2016	LOS ANGELES	100%	06/05/2016	28/07/2016	100%	06/05/2016	28/07/2016	\$ 1,958,724.92	\$ 1,958,724.92		
601106	INTERV URBANA SEGUNDA ETAPA ESTAMPADO CAMINO AL CE	GD 2016		91%	12/05/2016	17/08/2016	77%	12/05/2016		\$ 4,842,369.96	\$ 3,729,781.80		
601108	ACCESO SECUNDARIA JESUS ROMERO FLORES SNTA	GD 2016		20%	12/10/2016	20/12/2016	0%			\$ 3,000,000.00	\$ -		
601110	IMPLMN ECOTECNOLOGIAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUMN	GD 2016		51%	04/07/2016	30/12/2016	1%			\$ 3,997,525.33	\$ 48,720.00		
601112	ADECUACION DE ESPACIOS RED CARGA ELECTRICA VEHICUL	GD 2016		65%	04/07/2016	23/10/2016	21%	04/07/2016		\$ 989,888.00	\$ 204,735.28		
601114	CONSTRUCCION OFI Y ALMACEN AREA EVENTOS PRESI MUNC			0%			0%			\$ 600,000.00	\$ -		
601115	URBANIZACION VIALI EN LATERAL CARR ESTA 411			0%			0%			\$ 4,497,156.54	\$ 3,783,148.66		
601116	PAVIMENTACIÓN BOULEVARD DE LAS AMÉRICAS			0%			0%			\$ 748,169.91	\$ 579,434.12		
601119	PUENTE PEATONAL LIBRMTO SUR PONIENTE COM LOURDES	GD 2016	LOURDES	25%	29/08/2016	16/01/2017	0%			\$ 2,997,962.57	\$ -		
60199	INTERV URB INTERGAL EN VIALIDAD, PUERTA SAN RAFAEL	GD 2016	SAN RAFAEL	100%	25/05/2016	22/08/2016	89%	25/05/2016		\$ 3,471,010.76	\$ 3,096,227.71		
601111	MANTENIMIENTO EN VIALIDADES EN CORREGIDORA	GD 2016	CORREGIDORA	35%	22/08/2016	28/05/2017	0%			\$ 5,383,903.66	\$ -		
601118	MEJORAMIENTO DE VIALIDAD CALLE PEÑASCO, SNT BARBAR	GD 2016	SANTA BARBARA	100%	28/07/2016	07/09/2016	100%	28/07/2016	07/09/2016	\$ 243,803.14	\$ 243,803.14		
601120	CONCRETO ESTAMPADO CALLE ANDAMAXE1 COL SANTUARIOS	GD 2016	SANTUARIOS DEL PUEBLITO	91%	22/08/2016	13/11/2106	97%	22/08/2016		\$ 5,477,381.72	\$ 5,297,538.04		
601121	INT URB VIALIDADES VALLE DORADO 2000 ELEC, ILUMIN	GD 2016	VALLE DORADO	86%	06/07/2016	27/09/2016	0%			\$ 484,907.25	\$ -		
601122	SOLUCION PLUVIAL CALLE FELIPE SÉVILLA CANDILES	GD 2016	CANDILES	100%	22/08/2016	18/09/2016	89%			\$ 295,994.80	\$ 262,442.99		
601124	REUB LINEA D MEDIA TENSION ESC JESUS ROMERO FLORES	GD 2016	SANTA BARBARA	53%			0%			\$ 500,000.00	\$ -		
601125	CONSTRUCCION ARCOTECNO COBAQ PLANTEL 3 LOS OLVERA	GD 2016	LOS OLVERA	7%			0%			\$ 1,500,000.00	\$ -		
601129	BOLSA PARA ATENDER COTINGENCIAS DE INFRST PLUVIAL	GD 2016	CORREGIDORA	5%			0%			\$ 500,000.00	\$ -		
601127	MAC BANQUETAS Y GUARNICIONES, LA NEGRETA 1RA ETAPA	GD 2016	LA NEGRETA	100%	12/10/2016	22/12/2016	0%			\$ 400,000.00	\$ 376,847.92		
601128	MAC BANQUETAS Y GUARNICIONES, LA NEGRETA 2DA ETAPA	GD 2016	LA NEGRETA	0%	01/11/2016	09/01/2017	0%			\$ 61,300.00	\$ -		
601134	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS AREA ADJUNTA PRESID	GD 2016		0%						\$ 600,000.00	\$ -		
601135	BARDA COLNDNT ZONA D BOMBAS AGUA CEA PARQUE LINEAL	GD 2016		0%						\$ 387,110.36	\$ -		
601130	CONSTR MURO COLINDANCIA COMP EN REHAB DE RIO PUEBL	GD 2016		0%	08/11/2016	18/12/2016				\$ 700,000.00	\$ -		
601131	TRABAJOS DE VIALIDAD CAMINO A LAS FLORES	GD 2016		0%						\$ 6,000,000.00	\$ -		
601138	MAC TRABAJOS URBANIZACION TRAMO I LOS OLVERA	GD 2016		0%						\$ 500,000.00	\$ -		
601139	MAC TRABAJOS URBANIZACION TRAMO II LOS OLVERA	GD 2016		0%						\$ 500,000.00	\$ -		
63101	3X1 REHABILITACION DE PLAZA CIVICA LOURDES	GD 2016		37%						\$ 500,000.00	\$ -		
601137	DUCTERIA INSTALACIONES FIBRA OPTICA C PEDRO URTIAG	GD 2016		0%						\$ 47,850.89	\$ -		
601136	URBANIZACION DE CALLES VALLE DE SANTIAGO	GD 2016		0%						\$ 95,326.41	\$ -		
601141	TRABAJOS ADICIONALES ESCUELA OCTAVIO PAZ EL PORTICO	GD 2016		0%						\$ 247,509.44	\$ -		
601140	PUYON EN TEJEDA	GD 2016		0%						\$ 890,000.00	\$ -		
601142	CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN AVENIDA GOBERNADORES	GD 2016		0%						\$ 2,531,100.00	\$ -		
GASTO DIRECTO 2016										\$ 61,868,014.46	\$ 23,722,810.68		

L.A. GUSTAVO ARTURO LEAL MAYA
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

ARQ. OROZCO VEGA FERNANDO JULIO CESAR
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
